

ev. č. zmluvy objednávateľa: 68/2020

**Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ev. č. obj.: 68/2020**  
**uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení**  
**neskorších predpisov (ďalej len „Dodatok č. 1“)**

**Článok I.**  
**Zmluvné strany**

**1. Objednávateľ:** **Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.**  
So sídlom: Priemyselná 10, 921 79 Piešťany  
Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Púčik, predseda predstavenstva a.s.  
Ivan Šiška, podpredseda predstavenstva a.s.  
IČO: 36 252 484 DIČ: 2020172264  
IČ DPH: SK2020172264 Bankové spojenie: VÚB, a.s.  
Číslo účtu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212; SWIFT (BIC): SUBASKBX  
Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vložka č. 10263/T.  
(ďalej ako „objednávateľ“)

a

**2. Zhotoviteľ:** **APROX Invest, spol. s.r.o.**  
So sídlom: Prokopova 1091/24, 851 01 Bratislava  
Štatutárny zástupca: Ing. Milan Kollár - konateľ spoločnosti  
Osoba oprávnená konať v mene zhotoviteľa:  
- vo veciach technických, zmluvných a cenových: Ing. Milan Kollár, mobil: 0905 654 752  
IČO: 35 813 610  
DIČ: 2020224415  
IČ DPH: SK 2020224415  
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.  
Číslo účtu IBAN: SK58 1100 0000 0026 2673 4240; SWIFT (BIC): TATRSKBX  
Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 24251/B  
(ďalej ako „zhotoviteľ“ a objednávateľ a zhotoviteľ spolu aj ako „zmluvné strany“)

**Článok II.**  
**Úvodné ustanovenia**

1. Dňa 29.6.2020 nadobudla platnosť zmluva o dielo, reg. č. obj.: 86/2020 medzi zmluvnými stranami uvedenými v čl. I *Zmluvné strany* (ďalej len „zmluva“), na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal vykonať pre objednávateľa dielo „*Vypracovanie projektovej dokumentácie pre vytvorenie halového objektu pre parkovanie motorových vozidiel*“ (ďalej len „dielo“), a to za podmienok dohodnutých zmluvou.
2. Zhotoviteľ dňa 20.08.2020 požiadal objednávateľa o predĺženie termínu realizácie diela z dôvodu potreby dlhšieho časového obdobia potrebného na získanie všetkých dostupných informácií, dôležitých technických podkladov potrebných na realizáciu diela a všetkých potrebných rozhodnutí a stanovísk súvisiacich s vydaním stavebného povolenia na stavbu, ktorej sa dielo týka. Zmluvné strany sa na základe vyššie uvedeného dohodli na uzavretí Dodatku č. 1 k zmluve, ktorým sa upraví termín realizácie diela.

**Článok III.**  
**Zmena termínu realizácie diela**

1. Predmetom Dodatku č. 1 je dohoda zmluvných strán podľa čl. X. ods. 2 zmluvy o zmene (predĺžení) termínu realizácie diela. V nadväznosti na uvedené sa znenie čl. III. ods. 1 zmluvy mení tak, že sa pôvodne dohodnutý termín realizácie diela "do 2 mesiacov odo dňa platnosti zmluvy" vypúšťa a nahrádza sa novým termínom realizácie diela "**do 28. februára 2021**". Takto dohodnutý termín realizácie diela považujú zmluvné strany za primeraný a zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo v tomto termíne.


**Článok IV.**  
**Záverečné ustanovenia dodatku**

1. Zmluvné strany potvrdzujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, s jeho obsahom súhlasia, nakoľko je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle zbavenej akýchkoľvek omylov, na znak čoho ho aj vlastnoručne podpisujú.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu poslednou zmluvnou stranou a účinnosť v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. *Občiansky zákonník*.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží 2 (dva) rovnopisy Dodatku č. 1 a zhotoviteľ obdrží 1 (jeden) rovnopis Dodatku č. 1.
4. Ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú upravené odlišne Dodatkom č. 1, zostávajú v platnosti a účinnosti nezmenené.
5. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

Príloha č. 1: Žiadosť zhotoviteľa o predĺženie termínu realizácie diela zo dňa 20.08.2020

Za objednávateľa: 02.12.2020

**Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.**

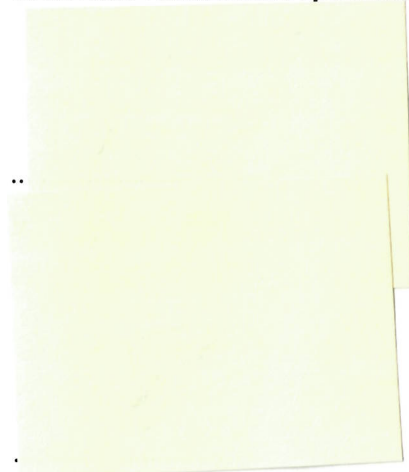

Ivan Šiška  
podpredseda predstavenstva a.s.

Za zhotoviteľa: 17.11.2020

**APROX Invest, spol. s r.o.**



**APROX Invest spol. s r.o.**  
Prokopova 24  
851 01 Bratislava  
IČO: 35813610, IČ DPH: SK2020224415
