

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo ev. č. obj.: 152/2019

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej iba „**dodatok**“ alebo „**dodatok č.2**“)

Článok I **Zmluvné strany**

1. Objednávateľ: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

So sídlom: Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Púčik, predseda predstavenstva a.s.
Ivan Šiška, podpredseda predstavenstva a.s.

Osoba oprávnená konať v mene objednávateľa:

- vo veciach technických: Ing. Jiří Kabát (technický dozor)
- vo veciach zmluvných: JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M

IČO: 36 252 484
DIČ: 2020172264
IČ DPH: SK 2020172264
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212
SWIFT (BIC): SUBASKBX
Telefón: 033/59 66 101

Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vložka č.10263/T.
(ďalej ako „objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ: VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.

So sídlom: Röntgenova 26, 851 01 Bratislava
Štatutárny zástupca: Ing. Karol Urban – predseda predstavenstva a.s.
Štefan Kobes – podpredseda predstavenstva a.s.

Osoba oprávnená konať v mene zhotoviteľa:

- vo veciach technických: Ing. Pavel Dubaj

IČO: 31 322 301
DIČ: 2020313427
IČ DPH: SK2020313427
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu IBAN: SK 98 1111 0000 0014 2803 5065
SWIFT (BIC): UNCRSKBX

Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č. 398/B.
(ďalej ako „zhotoviteľ“ a objednávateľ a zhotoviteľ spolu aj ako „zmluvné strany“)

Článok II **Úvodné ustanovenia**

1. Dňa 22. októbra 2019 nadobudla platnosť Rámcová zmluva o dielo, reg. č. obj.: 152/2019 medzi zmluvnými stranami uvedenými v čl. I *Zmluvné strany* (ďalej tiež len „*zmluva*“), na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal vykonať pre objednávateľa dielo „**Realizácia vodomerných šácht a pripojení nehnuteľností na verejný vodovod v obciach Križovany nad Dudváhom, Opoj a Vlčkovce**“ za podmienok dohodnutých zmluvou.

2. Dňa 31. marca 2020 uzatvorili zmluvné strany Dodatok č. 1 k zmluve, ktorého predmetom bola špecifikácia rámcového plnenia zhotoviteľa v rámci zmluvy v nadväznosti na skutočnosti zistené v priebehu realizácie čiastkových diel (rozšírenie rozsahu diela o položku *elektrotvarovky*) s uvedeným cien jednotlivých čiastkových plnení. Týmto došlo k zmene čl. IV ods. 1 zmluvy, do ktorého boli včlenené Tabuľky A-D, ktoré slúžia na kalkuláciu cien jednotlivých čiastkových diel, ktoré zhotoviteľ pre objednávateľa na podklade jeho objednávok vykonal a za ktoré má zhotoviteľ nárok na úhradu.
3. Služobným listom č. 4932/2020 žiadal Ing. Jiří Kabát (technický dozor) o vypracovanie dodatku k zmluve, ktorého predmetom bude úprava zmluvy v nadväznosti na naviac práce (práce nad rámec Tabuliek A-D v čl. IV ods. 1 zmluvy), ktoré zhotoviteľ pre objednávateľa na jeho žiadosť poskytol a ktoré boli nevyhnutne potrebné na úspešnú realizáciu diela (ako súhrnu čiastkových diel realizovaných na podklade zmluvy). Tieto náklady (naviac práce) vo výške 9.280,60 Eur bez DPH (DPH 20%: 1856,12 Eur, cena naviac prác s DPH: 11.136,72 Eur) považujú zmluvné strany za účelne vynaložené a vzájomné vzťahy k týmto naviac prácam preto upravujú vo forme dodatku k zmluve.
4. Zhotoviteľ a objednávateľ sa na základe vyššie uvedeného dohodli na uzatvorení Dodatku č. 2.

Článok III

Úhrada naviac prác a určenie konečnej ceny realizácie diela

1. Predmetom Dodatku č. 2 je dohoda zmluvných strán podľa čl. IV ods. 3 v spojení s čl. X ods. 3 zmluvy o zmene rozsahu diela o naviac práce poskytnuté zhotoviteľom a o úhrade takto vzniknutých nákladov, a to v nadväznosti na skutočnosti špecifikované v čl. II Dodatku č. 2.
2. V Čl. IV ods. 1 zmluvy sa mení tak, že za Tabuľku D sa vkladá nová tabuľka E s nasledovným znením

Tabuľka E.

<i>P.č.</i>	<i>Popis</i>	<i>MJ</i>	<i>konečná cena naviac prác spolu</i>
1.	<i>Naviac práce (odsúhlasené technickým dozorom)</i>	<i>kmpl</i>	<i>9.280,60 Eur</i>

3. Do čl. IV ods. 11 sa na záver za poslednú vetu ustanovenia dopĺňa nasledujúci text „Zmluvné strany sa dohodli, že cena za plnenie podľa Tabuľky E ods. 1 tohto článku zmluvy bude v tam uvedenej výške fakturovaná zhotoviteľom na podklade samostatnej faktúry, s lehotou splatnosti podľa čl. IV ods. 13 zmluvy, a to do 5 pracovných dní odo dňa platnosti Dodatku č. 2 k zmluve.“
4. Zmluvné strany taktiež potvrdzujú, že po individualizácii plnenia zhotoviteľa rámcovo vymedzeného v tabuľkách A-D čl. IV ods. 1 zmluvy je **konečnou cenou realizovaného diela** (ako súhrnu čiastkových diel), s výnimkou naviac prác podľa tabuľky E a čl. II ods. 3 Dodatku č. 2, cena 359.152,90 Eur bez DPH (DPH 20 % 71.830,58 Eur, cena diela s DPH 430.983,48 Eur). Uhradením tejto sumy a ceny naviac prác vo výške podľa ods. 2 tohto článku Dodatku č. 2 (pri započítaní pohľadávok podľa čl. IV dodatku č. 2) považuje zhotoviteľ všetky svoje nároky voči objednávateľovi vyplývajúce z realizácie diela na podklade zmluvy za vysporiadané a vzdáva sa práva na akékoľvek ďalšie plnenie z titulu realizácie diela - z titulu plnenia zmluvy (v znení jej všetkých neskorších dodatkov).

Článok IV Započítanie vzájomných pohľadávok

1. Predmetom Dodatku č. 2 je aj dohoda zmluvných strán o započítaní vzájomných pohľadávok - pohľadávky zhotoviteľa na poskytnutie plnenia z titulu realizovaných naviacprác vo výške podľa čl. III ods. 2 Dodatku č. 2 s pohľadávkou objednávateľa z titulu zmluvných sankcií pre omeškanie zhotoviteľa (v súlade s čl. VIII ods. 2 zmluvy) vo výške podľa nasledujúceho odseku tohto článku Dodatku č. 2.
2. Zmluvné strany potvrdzujú, že objednávateľovi vznikli v súvislosti s omeškaním zhotoviteľa nasledujúce čiastkové nároky:

- v súvislosti s plnením objednávky zo dňa evidovanej ako IV. v poradí vznikol objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **715,50 Eur** (cena čiastkového diela 46.161,00 Eur bez DPH, zhotoviteľ sa dostal do omeškania s jeho realizáciou v dĺžke 31 dní);

- v súvislosti s plnením objednávky zo dňa evidovanej ako V. v poradí vznikol objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **1.654,45 Eur** (cena čiastkového diela 70.402,00 bez DPH, zhotoviteľ sa dostal do omeškania s jeho realizáciou v dĺžke 47 dní);

- v súvislosti s plnením objednávky evidovanej ako VI. v poradí vznikol objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **1.252,44 Eur** (cena čiastkového diela 34.790,00 bez DPH, zhotoviteľ sa dostal do omeškania s jeho realizáciou v dĺžke 72 dní);

- v súvislosti s omeškaním zhotoviteľa podľa predchádzajúcich odrážok tohto odseku tohto článku dodatku č. 2 vznikol objednávateľovi nárok na paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky podľa § 369c ods. 1 zákona č. 513/1991 Z.z. *Obchodný zákonník* v spojení s § 2 nariadenia vlády SR č. 21/2013 Z.z. *ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka* vo výške **120 Eur** (paušálny nárok uplatnený v prípade všetkých troch čiastkových zmluvných vzťahov, s ktorými sa zhotoviteľ dostal do omeškania.

Celkové nároky objednávateľa voči zhotoviteľovi v zmysle tohto odseku tohto článku Dodatku č. 2 tak predstavujú sumu **3.742,39 Eur**.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že nárok objednávateľa vo výške podľa ods. 2 tohto článku dodatku č. 2 objednávateľ započíta na fakturovanú pohľadávku zhotoviteľa podľa čl. III ods. 3 Dodatku č. 2, a to po doručení príslušnej faktúry zhotoviteľa. Po započítaní uhradí objednávateľ zhotoviteľovi sumu vo výške **5.538,21 Eur**, a to v lehote splatnosti riadne vystavenej faktúry, čo zhotoviteľ podpisom Dodatku č. 2 akceptuje.

Článok V Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany potvrdzujú, že si Dodatok č. 2 prečítali, s jeho obsahom súhlasia, nakoľko je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle zbavenej akýchkoľvek omylov, na znak čoho ho aj vlastnoručne podpisujú.
2. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu poslednou zmluvnou stranou a účinnosť v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. *Občiansky zákonník*.
3. Dodatok č. 2 je vyhotovený v troch rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží 2 (dva) rovnopisy a zhotoviteľ obdrží 1 (jeden) rovnopis.
4. Ustanovenia zmluvy v znení jej Dodatku č. 1, ktoré nie sú upravené odlišne Dodatkom č. 2, zostávajú v platnosti a účinnosti nezmenené.

5. Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy reg. č. obj.: 152/2019 v znení jej Dodatku č. 1.

V Piešťanoch, dňa 16.07.2020


V Bratislave, dňa 13. JÚL 2020

za objednávateľa:

Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.


za zhotoviteľa:

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.

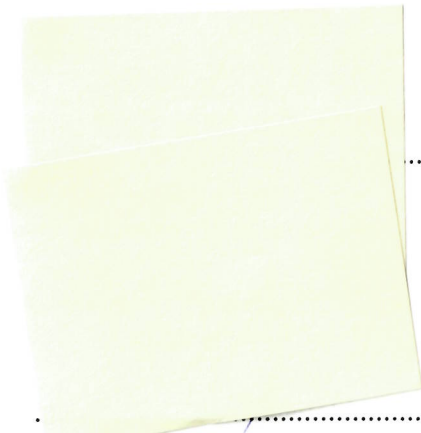

Ivan Šiška
podpredseda predstavenstva a.s.

TRNAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ
akciová spoločnosť
Priemyselná 10
921 79 Piešťany
-1-2-

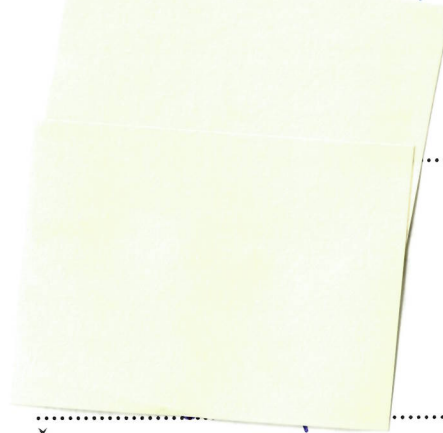

Štefan Kobes
podpredseda predstavenstva a.s.

 **VODOHOSPODÁRSKE
STAVBY a. s.**
Röntgenova 26
851 01 Bratislava
IČO: 31322201
