

Reg. č. objednávateľa: 185/2020

Reg. č. zhotoviteľa:

Zmluva o dielo

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
(ďalej iba „zmluva“)

Článok I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
So sídlom: Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Púčik, predseda predstavenstva a.s.
Ivan Šiška, podpredseda predstavenstva a.s.

Osoba oprávnená konať v mene objednávateľa:

- vo veciach technických (technický dozor): Ing. Jakub Slabý
- vo veciach zmluvných: JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M

IČO: 36 252 484

DIČ: 2020172264

IČ DPH: SK 2020172264

Bankové spojenie: VÚB, a.s.

Číslo účtu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212

SWIFT (BIC): SUBASKBX

Telefón: 033/59 66 101

Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vložka č. 10263/T.

(ďalej ako „objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ: FERRMONT, a.s.
So sídlom: Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchov
Štatutárny zástupca: Ing. Radovan Lahoda – predseda predstavenstva
Ing. Juraj Rutzký – člen predstavenstva
Ing. Tomáš Focko – člen predstavenstva

Osoba oprávnená konať v mene zhotoviteľa:

- vo veciach technických: Ing. Ivan Chromek

IČO: 31 619 916

DIČ: 2020441907

IČ DPH: SK 2020441907

Bankové spojenie: VÚB, a.s.

Číslo účtu IBAN: SK23 0200 0000 0003 8114 0372

SWIFT (BIC): SUBASKBX

Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Trenčín, odd. Sa, vložka č. 10737/R.

(ďalej ako „zhotoviteľ“ a objednávateľ a zhotoviteľ spolu aj ako „zmluvné strany“)

Článok II. Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zväzuje, že za podmienok dohodnutých v zmluve na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo pre objednávateľa zhotoví a dodá dielo: „**Dodanie a montáž zariadení pre zachytávanie plávajúcich nečistôt v odľahčovacích komorách kanalizácie v meste Trnava**“. Dielo celkovo pozostáva z rekonštrukcie existujúcich 22 objektov odľahčovacích komôr na kanalizačnej sieti v meste Trnava tak, aby tieto spĺňali požiadavky na odľahčovacie komory kanalizácie podľa § 6 Nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd v. z. n. p. Na predmetných odľahčovacích

komorách sa v súčasnosti realizuje stavebná rekonštrukcia a preto zhotoviteľ bude poskytovať plnenie dohodnuté zmluvou súbežne s iným zhotoviteľom rekonštrukčných prác odľahčovacích komôr. Samotné rekonštrukčné práce v rámci realizácie diela pozostávajú z dodania a montáže zariadení na zachytávanie plávajúcich nečistôt z kompozitných materiálov, pričom systém zariadenia na zachytávanie plávajúcich nečistôt je atypickým výrobkom, ktorý zhotoviteľ namontuje na mieste (v dotknutých odľahčovacích komorách) z nosných U profilov a ohýbaných kompozitných tyčí a použitý spojovací materiál je z nehrdzavejúcej ocele (tyče sú pevne spojené s nosnými profilmi v hornej časti a spodná časť je ponechaná ako ohybná, čím je zabezpečená samočistiaca schopnosť tyčí). Pri montáži predmetných zariadení v rámci realizácie diela je zhotoviteľ povinný dbať na požiadavku zabezpečenia samočistiacej schopnosti, t.j. aby pri samočistení hrablic nečistoty vždy padali pred prepadovú hranu (do škrtiacej trate), inak sa nepovažuje dielo za riadne zhotovené. Zhotoviteľ berie na vedomie, že celá dĺžka predmetného zariadenia je z montážnych dôvodov rozdelená na sekcie rôznej dĺžky a sekcia, ktorá je najbližšie k otvoru škrtiacej trate, je opatrená madlami a je odnímateľná, čím sa zabezpečí možnosť čistenia otvoru škrtiacej trate od naplavených predmetov. Zhotoviteľ berie tiež na vedomie, že realizácia diela môže prebiehať v čiastočne zatopenej časti odľahčovacích komôr a z tohto dôvodu si v rámci realizácie diela musí zriadiť pracovné plošiny (nakolko realizácia diela bude prebiehať za plnej prevádzky kanalizačnej siete. Plnenie poskytované zhotoviteľom je vymedzené v Prílohe č. 1 zmluvy.

2. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne a včas vyhotovené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu v súlade s článkom IV. zmluvy.
3. Rozsah diela a špecifikácia prác sú uvedené v Cenovej ponuke zhotoviteľa zo dňa 5. novembra 2020 (ďalej tiež aj „cenová ponuka“), ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy ako jej príloha č. 1 a v Projektovej dokumentácii vyhotovenej spoločnosťou HYCOPROJEKT, a.s., Prešovská 55, 821 02 Bratislava (ďalej tiež len „PD“). Zhotoviteľ podpisom zmluvy vyhlasuje, že má PD na účely realizácie diela k dispozícii, nepožaduje jej opätovné doručenie, je s ňou oboznámený a súhlasí s vykonaním diela v súlade s PD.
4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že si je vedomý podmienok, za ktorých bude dielo realizované a s realizáciou diela za týchto podmienok výslovne súhlasí. Dielo je zhotoviteľ povinný vyhotoviť tiež v súlade so záväznými pokynmi technického dozora objednávateľa. Pred začatím realizácie prác na zhotovovaní diela je zhotoviteľ povinný si nechať tieto pokyny technického dozora písomne odsúhlasiť, inak nesie zodpovednosť za vznik prípadnej škody v plnej výške, ako aj za to, že dielo prepracuje podľa pokynov zhotoviteľa na vlastné náklady. Realizácia diela musí prebiehať tak, aby nenastali dlhodobé odstávky objektov podľa čl. III ods. 2 zmluvy. Prerušenie prevádzky týchto objektov je zhotoviteľ oprávnený vykonať iba na základe a v súlade s pokynom technického dozora, pričom nesie zodpovednosť za akúkoľvek škodu spôsobenú prerušením alebo obmedzením prevádzky týchto odľahčovacích objektov bez súhlasu technického dozora alebo v rozpore s týmto súhlasom. Zmeny rozsahu realizovaného diela je nutné vykonať výlučne formou dodatku.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť dielo v zmysle platných noriem, smerníc a všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných na území SR. Zhotoviteľ zodpovedá za primeranosť, stabilitu a bezpečnosť všetkých operácií pri realizácii diela a za voľbu všetkých metód realizácie diela a pracovných postupov, ktoré musia byť vybrané v súlade s požiadavkou odbornej starostlivosti

Článok III.

Termín a miesto plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo v rozsahu podľa článku II. zmluvy v termíne do **3 mesiacov** odo dňa platnosti zmluvy a začať realizáciu diela do 5 dní odo dňa platnosti zmluvy. Zhotoviteľ je povinný dielo realizovať počas bezdažďového obdobia (čl. V ods. 1 písm. m) zmluvy). V prípade okolností objektívnej povahy spočívajúcich v dĺžke trvania zrážkového obdobia počas doby realizácie diela podľa ods. 1 tohto článku zmluvy (kedy nemožno dielo efektívne realizovať) má zhotoviteľ nárok na zmenu termínu realizácie diela - jeho predĺženie o dĺžku prekážok poveternostného charakteru, pre ktoré nebolo možné v realizácii diela

pokračovať a včasne ho zhotoviť. Zmenu termínu realizácie diela vykonajú zmluvné strany vo forme dodatku k zmluve.

2. Miesta realizácie diela - jednotlivé odľahčovacie komory sú určené prostredníctvom GPS súradníc aj opisným spôsobom nasledovne:

1. **OK 1B** - OK sa nachádza v južnej časti mesta Trnava, v blízkosti ulice Zelenečská konkrétne v zatravnenej časti vedľa chodníka oproti skleníku. GPS súradnice OK sú 48°21'36,9'', 17°35'24,8''. Odľahčovacia stoka je zaústená do Trnávky cca 115 m od OK v smere kolmo na pravý breh. Stoková sieť je jednotnej stokovej sústavy, dažďové vody ale neodtekajú z celého územia mesta.

2. **OK 2B** - OK sa nachádza v centrálnej časti Trnavy, v komunikácii pre motorové vozidlá a čiastočne zasahuje do kruhového objazdu na križovatke ulíc Tamaškovičova, 9. mája, Zelenečská a Dohnányho. GPS súradnice OK sú 48°21'59,72'', 17°35'17,81''. Odľahčovacia stoka vyúsťuje do rieky Trnávka cca 150,0 m od OK v smere kolmo na pravý breh. Stoková sieť je jednotnej stokovej sústavy, dažďové vody ale neodtekajú z celého územia mesta.

3. **OK 3B** - OK sa nachádza v centrálnej časti mesta Trnava, na ulici Hospodárska, konkrétne v chodníku vedľa zastávky MHD. GPS súradnice OK sú 48°37'29,73'', 17°58'42,16''. Odľahčovacia stoka je zaústená do Trnávky cca 25 m od OK v smere kolmo na pravý breh. Stoková sieť je jednotnej stokovej sústavy, dažďové vody ale neodtekajú z celého územia mesta.

4. **OK 4B** - OK sa nachádza v centrálnej časti mesta Trnava, na ulici Hospodárska, konkrétne na parkovisku oproti Tácke. GPS súradnice OK sú 48°22'26,74'', 17°35'0,75''. Odľahčovacia stoka je zaústená do Trnávky cca 18 m od OK v smere kolmo na pravý breh. Stoková sieť je jednotnej stokovej sústavy, dažďové vody ale neodtekajú z celého územia mesta.

5. **OK 5B** - OK sa nachádza v centrálnej časti mesta Trnava, na ulici Hospodárska, konkrétne v zelenom páse medzi pravým brehom Trnávky a cestou, pod mostom (pod bránou) ku kostolu svätého Jakuba. GPS súradnice OK sú 48°22'35,32'', 17°34'55,93''. Odľahčovacia stoka je zaústená do Trnávky cca 10 m od OK v smere kolmo na pravý breh. Stoková sieť je jednotnej stokovej sústavy, dažďové vody ale neodtekajú z celého územia mesta.

6. **OK 6B** - OK sa nachádza v centrálnej časti mesta Trnava, na ulici Hospodárska, konkrétne v zelenom páse medzi pravým brehom Trnávky a cestou, pod mostom (pod bránou) ku kostolu svätého Jakuba. GPS súradnice OK sú 48°22'35,32'', 17°34'55,93''. Odľahčovacia stoka je zaústená do Trnávky cca 10 m od OK v smere kolmo na pravý breh. Stoková sieť je jednotnej stokovej sústavy, dažďové vody ale neodtekajú z celého územia mesta.

7. **OK 7B** - OK sa nachádza v severozápadnej časti Trnavy, v chodníku (čiastočne zasahuje do cesty) pri križovatke ulíc Hospodárska, Trstínska cesta a Šrobárova ulici (oproti Merкуру). GPS súradnice OK sú 48°22'57,60'', 17°34'43,64''. Odľahčovacia stoka vyúsťuje do rieky Trnávka cca 20,0 m od OK v smere kolmo na pravý breh potoku. Stoková sieť je jednotnej stokovej sústavy, dažďové vody ale neodtekajú z celého územia mesta.

8. **OK 8B** - OK sa nachádza v severozápadnej časti mesta Trnava medzi Trstínska cesta a starým cukrovarom. GPS súradnice OK sú 48°23'00,0'', 17°34'40,7''. Odľahčovacia stoka je zaústená do toku Trnávka vo vzdialenosti cca 11 m od OK v smere šikmo na pravý breh. Stoková sieť je jednotnej stokovej sústavy, dažďové vody ale neodtekajú z celého územia mesta.

9. **OK 9B** - OK sa nachádza v severozápadnej časti mesta Trnava v blízkosti kruhového objazdu medzi ulicami Trstínska cesta a Cukrová. GPS súradnice OK sú 48°23'09,2'',



17°34'30,5". Odľahčovacia stoka je zaústená do toku Trnávka vo vzdialenosti cca 25 m od OK v smere šikmo na pravý breh. Stoková sieť je jednotnej stokovej sústavy, dažďové vody ale neodtekajú z celého územia mesta.

10. OK 10B - OK sa nachádza v severozápadnej časti mesta Trnava v kruhovom objazde medzi ulicami Suchovská a Ružindolská. GPS súradnice OK sú 48°23'05,1", 17°34'18,3". Odľahčovacia stoka je zaústená do toku Trnávka vo vzdialenosti cca 280 m od OK v smere šikmo na pravý breh. Stoková sieť je jednotnej stokovej sústavy, dažďové vody ale neodtekajú z celého územia mesta.

11. OK 1G - OK sa nachádza v južnej časti Trnavy, v komunikácii (konkrétne v parkovisku) na ulici Zelenečskej pred obchodom ČKD Market. GPS súradnice OK sú 48°21'33,49", 17°35'24,50". Odľahčovacia stoka vyúsťuje do rieky Trnávka cca 130,0 m od OK v smere kolmo na pravý breh potoku. Stoková sieť je jednotnej stokovej sústavy, dažďové vody ale neodtekajú z celého územia mesta.

12. OK 1D - OK sa nachádza v severnej časti Trnavy, v komunikácii v zelenom páse pri križovatke ulíc Rybníková a Hornopotočná pred halou Družba. GPS súradnice OK sú 48°22'55,9", 17°35'11,3". Odľahčovacia stoka vyúsťuje do rieky Trnávka cca 40,0 m od OK v smere kolmo na ľavý breh. Stoková sieť je jednotnej stokovej sústavy, dažďové vody ale neodtekajú z celého územia mesta.

13. OK 1 II - OK sa nachádza v centre mesta Trnava v pešej zóne Hlavnej ulice v blízkosti Okresného súdu Trnava. GPS súradnice OK sú 48°22'24,9", 17°35'14,1". Odľahčovacia stoka je zaústená do toku Trnávka vo vzdialenosti cca 46,0 m od OK v smere šikmo na ľavý breh. Stoková sieť je jednotnej stokovej sústavy, dažďové vody ale neodtekajú z celého územia mesta.

14. OK 1 I - OK sa nachádza v centre mesta Trnava v križovatke Kollárovej a Športovej ulice v blízkosti futbalového štadióna. GPS súradnice OK sú 48°22'21,0", 17°35'27,7". Odľahčovacia stoka je zaústená do toku Trnávka vo vzdialenosti cca 140,0 m od OK v smere šikmo na ľavý breh. Stoková sieť je jednotnej stokovej sústavy, dažďové vody ale neodtekajú z celého územia mesta.

15. OK 3A - OK sa nachádza v centre mesta Trnava v Kollárovej ulici v blízkosti futbalového štadióna. GPS súradnice OK sú 48°22'24,0", 17°35'37,1". Odľahčovacia stoka je zaústená do odľahčovacej stoky z OK 16 vo vzdialenosti cca 10,0 m a spolu sú vyústené do toku Trnávka vo vzdialenosti cca 330,0 m od sútoku v smere šikmo na ľavý breh. Stoková sieť je jednotnej stokovej sústavy, dažďové vody ale neodtekajú z celého územia mesta.

16. OK 2AN1 - OK sa nachádza v centre mesta Trnava v Kollárovej ulici v blízkosti križovatky so Sladovníckou ulicou v blízkosti nákupného centra pri futbalovom štadióne. GPS súradnice OK sú 48°22'24,5", 17°35'38,5". Odľahčovacia stoka je zaústená do toku Trnávka vo vzdialenosti cca 390,0 m od OK v smere šikmo na ľavý breh. Stoková sieť je jednotnej stokovej sústavy, dažďové vody ale neodtekajú z celého územia mesta.

17. OK 1AN - OK sa nachádza v južnej časti mesta Trnava vo Vlárskej ulici. GPS súradnice OK sú 48°21'49,1", 17°35'33,7". Odľahčovacia stoka je vyústená do toku Trnávka vo vzdialenosti cca 75,0 m od OK16 v smere šikmo na ľavý breh. Stoková sieť je jednotnej stokovej sústavy, dažďové vody ale neodtekajú z celého územia mesta.

18. OK 1A2 - OK sa nachádza v južnej časti mesta Trnava v Mikovíniho ulici. GPS súradnice OK sú 48°21'31,4", 17°35'41,0". Odľahčovacia stoka je spolu z odľahčovacou stokou z OK 2A zaústená do toku Trnávka vo vzdialenosti cca 220 m od OK 1A2 v smere šikmo na ľavý breh. Stoková sieť je jednotnej stokovej sústavy, dažďové vody ale neodtekajú z celého územia mesta.

19. **OK 1AM** - OK sa nachádza v južnej časti mesta Trnava v Mikovíniho ulici. GPS súradnice OK sú 48°21'31,7'', 17°35'42,5''. Odľahčovacia stoka je zaústená do odľahčovacej stoky z OK 1A2 vo vzdialenosti cca 65,0 m s vyústením do toku Trnávka vo vzdialenosti cca 220 m od OK 1A2 v smere šikmo na ľavý breh. Stoková sieť je jednotnej stokovej sústavy, dažďové vody ale neodtekajú z celého územia mesta.

20. **OK 2AI** - OK sa nachádza v extraviláne mesta Trnava v smere na Modranku v blízkosti začiatku cestného obchvatu Trnavy. GPS súradnice OK sú 48°21'28,2'', 17°36'03,3''. Odľahčovacia stoka je zaústená do toku Trnávka vo vzdialenosti cca 550 m od K v smere šikmo na ľavý breh. Stoková sieť je jednotnej stokovej sústavy, dažďové vody ale neodtekajú z celého územia mesta.

21. **OK 1K** - OK sa nachádza v extraviláne obce Modranka v blízkosti toku Trnávka priamo v telese hrádze. GPS súradnice OK sú 48°20'37,2'', 17°36'49,7''. Odľahčovacia stoka je zaústená do Trnávky cca 16 m od OK v smere šikmo na ľavý breh. Stoková sieť je jednotnej stokovej sústavy, dažďové vody ale neodtekajú z celého územia obce.

22. **OK ČOV** - OK sa nachádza v areáli ČOV Zeleneč v blízkosti diaľnice D1. GPS súradnice OK sú 48°19'40,2'', 17°36'54,8''. Odľahčovacia komora slúži ako rozdeľovacia šachta pred ČOV a zabezpečuje obtok ČOV. Stoková sieť je jednotnej stokovej sústavy, dažďové vody ale neodtekajú z celého územia mesta.

3. V prípade, ak zhotoviteľ ukončí dielo pred termínom uvedeným v ods. 1 tohto článku, objednávateľ sa zaväzuje riadne ukončené dielo od zhotoviteľa prevziať aj v tomto skoršom termíne.
4. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť zrealizovať dielo jeho riadnym zhotovením a odovzdaním celého diela objednávateľovi - podpísaním Protokolu o odovzdaní a prevzatí riadne zhotoveného diela oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. V protokole o odovzdaní a prevzatí zhotoveného diela sa uvedú prípadné vady alebo nedorobky, ktoré má odovzdávané dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Objednávateľ je však oprávnený odmietnuť prevzatie diela v prípade, ak má dielo vady alebo nedorobky, a to až do doby ich odstránenia. Protokol podľa tohto odseku tohto článku zmluvy podpisujú zmluvné strany až po ukončení prác na realizácii diela na poslednom objekte podľa ods. 2 tohto článku zmluvy (nakolko až vtedy sa považuje dielo za zhotovené).
5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že s príslušnou dokumentáciou vzťahujúcou sa k realizácii diela sa riadne oboznámil pred uzatvorením zmluvy a objednávateľ sa zhotoviteľovi zaväzuje poskytnúť súčinnosť nevyhnutne potrebnú na zrealizovanie diela.

Článok IV.

Cena diela a platobné podmienky

1. Zmluvné strany dohodli na rozsah diela uvedený v článku II. Predmet plnenia, v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách, pevnú cenu zahŕňajúcu všetky náklady zhotoviteľa na zrealizovanie diela, vrátane dopravných nákladov, vo výške:

Cena celého diela spolu bez DPH:	60.897,43 €
DPH 20%	12.179,49 €
Cena celého diela spolu s DPH:	73.076,92 €

Slovom : sedemdesiattritisíc sedemdesiatšesť Eur, 92 centov

Prenesenie daňovej povinnosti - dodanie stavebných prác podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“).

2. Zmluvné strany sa dohodli, že cena celého diela spolu podľa ods. 1. tohto článku zmluvy je konečná a nemenná, zahŕňajúca všetky náklady zhotoviteľa na realizáciu diela a splnenie povinností podľa čl. V zmluvy. Navýšenie zmluvnej ceny diela je možné iba na základe písomne uzatvoreného dodatku k zmluve z dôvodu preukázateľne vykonaných navyše prác nad rámec cenovej ponuky, odsúhlasených objednávateľom v takto uzatvorenom dodatku.
3. Zmluvné strany berú na vedomie prenesenie daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH. V prípade dodania tovarov alebo služieb v rámci realizácie diela, ktoré nepodliehajú preneseniu daňovej povinnosti, je zhotoviteľ oprávnený fakturovať objednávateľovi aj DPH.
4. V prípade zmeny sadzby DPH počas realizácie diela, bude táto účtovaná v zmysle právnych predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platných a účinných v čase uskutočnenia zdaniteľného plnenia, pričom v prípade prenosu daňovej povinnosti podľa § 69 zákona o DPH, nie je zhotoviteľ oprávnený účtovať spolu s cenou diela aj DPH, ale ním vystavená faktúra musí obsahovať slovnú informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“, pričom objednávateľ ako platiteľ, ktorý je príjemcom plnenia, je v takomto prípade osobou povinnou platiť DPH. V prípade zmeny právnej úpravy týkajúcej sa povinnosti platiť DPH, sú zmluvné strany povinné postupovať podľa právnych predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platných v čase uskutočnenia zdaniteľného plnenia.
5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpisu zmluvy nie je dlžníkom správcu dane a neexistujú dôvody, na základe ktorých by sa objednávateľ mal stať ručiteľom za daň podľa § 69 ods. 14 v spojení s § 69b zákona o DPH v znení neskorších predpisov a nie je zaradený do zoznamu platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH, vedenom Finančným riaditeľstvom SR a zverejnenom na portáli Finančnej správy Slovenskej republiky. Zhotoviteľ ďalej vyhlasuje, že bezodkladne po tom, ako bude mať vedomosť, že je zaradený do zoznamu platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH, túto skutočnosť písomne oznámi objednávateľovi.
6. Objednávateľ je oprávnený zadržať z fakturovanej ceny diela (alebo jej časti) sumu zodpovedajúcu sume DPH uvedenej na každej faktúre vystavenej zhotoviteľom v prípade, ak u zhotoviteľa nastanú dôvody na zrušenie registrácie podľa § 81 ods. 4 písm. b) druhého bodu zákona o DPH v znení neskorších predpisov, alebo ak zhotoviteľ bude zverejnený v príslušnom zozname osôb na zrušenie registrácie pre DPH vedenom Finančným riaditeľstvom SR, alebo ak bude daná dôvodná obava, že zhotoviteľ príslušnú DPH alebo jej časť v rozpore so zákonom o DPH nezaplatí. Objednávateľ je oprávnený takto zadržanú sumu použiť na úhradu neuhradenej DPH z faktúr vystavených zhotoviteľom objednávateľovi.
7. Objednávateľ, ktorému bola podľa § 69b zákona o DPH ako ručiteľovi uložená rozhodnutím daňového úradu povinnosť uhradiť nezaplatenú DPH alebo jej časť za zhotoviteľa, alebo ak daňový úrad vydá rozhodnutie o tom, že použije na úhradu zhotoviteľom nezaplatenej DPH alebo jej časti nadmerný odpočet objednávateľa alebo jeho časť, je oprávnený požadovať od zhotoviteľa náhradu za takto uhradenú nezaplatenú DPH alebo jej časť.
8. Ak sa naplnia podmienky podľa § 69 a 69b zákona o DPH, zhotoviteľ sa zaväzuje uhradiť objednávateľovi všetky finančné náklady, ktoré v tejto súvislosti objednávateľovi vzniknú.
9. Z ceny celého diela spolu bez DPH uvedenej v ods. 1 tohto článku zmluvy je objednávateľ oprávnený zadržať čiastku vo výške 10 %. V prípade, že v Protokole o odovzdaní a prevzatí zhotoveného diela budú uvedené drobné vady a nedorobky, ktoré nebránia prevzatíu diela, vyplatí sa polovica z celej zadrživanej čiastky po ich odstránení, pričom objednávateľ je povinný túto zadržanú čiastku uhradiť na účet zhotoviteľa do 15 dní po podpísaní zápisu o ich odstránení oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
10. Zvyšná časť zo zadrživanej čiastky sa zhotoviteľovi vyplatí až po uplynutí záručnej doby podľa čl. VII ods. 2 zmluvy, pokiaľ budú všetky v záručnej dobe objednávateľom reklamované vady zhotoviteľom riadne odstránené. Zadrživanú sumu je objednávateľ oprávnený použiť na úhradu nákladov na realizáciu opráv diela v prípade, ak odstránenie väd diela nezabezpečí zhotoviteľ.
11. Zmluvné strany sa dohodli, že preddavky sa nebudú poskytovať.

12. Platby budú realizované bezhotovostným spôsobom na základe faktúr priebežne vystavovaných zhotoviteľom na základe reálne vykonaného plnenia, pričom zhotoviteľ jej oprávnený vystaviť faktúru najviac raz za kalendárny mesiac.
13. Podkladom pre vystavenie faktúry bude zhotoviteľom vyhotovený a k faktúre priložený súpis vykonaných prác a dodávok schválených technickým dozorom objednávateľa a musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán a tiež mesačná správa o postupe realizácie diela, obsahujúca popis zrealizovaných prác po stránke finančnej aj vecnej, prípadne aj fotodokumentáciu. Konečnú - zúčtovaciu faktúru sa zhotoviteľ zaväzuje vystaviť do 5 pracovných dní po písomnom (protokolárnom) prevzatí zhotoveného diela objednávateľom podľa čl. III ods. 4 zmluvy. Prílohou faktúry je aj Protokol o odovzdaní a prevzatí riadne a včas zhotoveného diela podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Spolu s Protokolom sa objednávateľovi odovzdá aj celkový súpis vykonaných prác a dodávok schválených technickým dozorom objednávateľa, podpísaný oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán, a iné dokumenty, ktoré objednávateľ poskytol zhotoviteľovi na účely plnenia zmluvy alebo ktoré sú nevyhnutne potrebné na riadne užívanie zhotoveného diela alebo uplatnenie prípadnej reklamácie diela.
14. Zhotoviteľ sa zaväzuje vystaviť faktúru v elektronickej forme a doručiť ju objednávateľovi na efaktury@tavos.sk.
15. Faktúry musia obsahovať všetky náležitosti faktúry podľa zákona o DPH a číslo zmluvy podľa evidencie objednávateľa ako aj ďalšie podklady – prílohy k faktúre ktoré sú uvedené v ods. 13 tohto článku zmluvy. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej vystavenia, pričom musí byť doručená objednávateľovi najneskôr 20 dní pred termínom jej splatnosti. Dňom doručenia faktúry je deň zaevidovania faktúry na podateľni objednávateľa (v súlade s internými predpismi objednávateľa). V prípade, že vo faktúre budú uvedené nesprávne údaje, alebo nebude obsahovať všetky náležitosti a podmienky uvedené v zmluve, je to dôvod na odmietnutie faktúry a jej vrátenie na prepracovanie. Zhotoviteľ nemá za daných okolností právo fakturovať sankciu z omeškania úhrady faktúry. Nová lehota splatnosti v danom prípade začne plynúť až po doručení novej faktúry objednávateľovi.
16. V prípade vrátenia faktúry je objednávateľ povinný písomne informovať zhotoviteľa o dôvodoch jej vrátenia, pričom zhotoviteľ je povinný vystaviť novú opravenú faktúru s novou lehotou splatnosti a prípadne aj doplniť požadované chýbajúce prílohy.
17. V prípade, že pri realizácii diela nebude nutné zrealizovať všetky položky podľa Cenovej ponuky, alebo bude postačovať ich vykonanie v menšom rozsahu, zhotoviteľ bude fakturovať objednávateľovi iba za skutočne realizované práce a dodávky. Súpis týchto nevykonaných prác (plnení), odsúhlasených technickým dozorom objednávateľa, predloží zhotoviteľ objednávateľovi do prílohy k zúčtovacej faktúre podľa ods. 13 tohto článku zmluvy.

Článok V. Podmienky vykonania diela

1. Povinnosti zhotoviteľa:
 - a) Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť dielo riadne, s náležitou odbornou starostlivosťou, v rámci dohodnutého rozsahu a dohodnutých termínov, v súlade s platnými normami, smernicami, a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území SR.
 - b) Za riadenie prác, ktoré súvisia s realizáciou diela zodpovedá Ing. Ivan Chromek (0902 906 022, ivan.chromek@ferrmont.sk), ktorý je oprávnený vykonávať zápisy do stavebného denníka, podpisovať a odovzdávať objednávateľovi práce ako i dielo, ktorého realizácia je predmetom zmluvy.
 - c) Stavebný denník založí zhotoviteľ diela.
 - d) Zhotoviteľ je povinný zaslať oznámenie na príslušný inšpektorát práce v zmysle NV SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, ak dielo podlieha tomuto oznámeniu v zmysle tohto nariadenia.
 - e) Zhotoviteľ diela je povinný na pracovisku dodržiavať predpisy BOZP a PO v zmysle zákonov a vyhlášok platných na území SR, a to tak na úseku „Bezpečnosti a ochrany

zdravia pri práci“ ako aj na úseku „Požiarnej ochrany“. V rámci plnenia uvedených povinností zhotoviteľ zodpovedá u svojich zamestnancov, vrátane pracovníkov subdodávateľských prác a činností pre zhotoviteľa, v celom rozsahu za plnenie povinností na úseku BOZP, ktoré vyplývajú zo zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a zo súvisiacich predpisov z danej oblasti (oboznamovanie - školenie, zdravotná starostlivosť, určenie rizík, odborná spôsobilosť, vybavenosť OOPP, kontrola dodržiavania zásad BP, pracovné úrazy, poskytovanie prvej pomoci, výstražné označenia, zábrany, zákazy fajčenia, požívania alkoholických nápojov a iné).

- f) Zhotoviteľ zabezpečí dodržanie zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarimi v znení neskorších zmien a doplnení a ustanovenia vyhlášky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších zmien a doplnení vrátane ustanovení súvisiacich predpisov pre danú oblasť a zabezpečí školenie svojich pracovníkov a pracovníkov svojich subdodávateľov v rámci dotknutých predpisov.
- g) Zhotoviteľ je povinný počas realizácie diela likvidovať ostatný aj nebezpečný odpad v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj v zmysle príslušných vykonávacích predpisov a doložiť pri odovzďavacom a preberacom konaní predpísaný doklad o jeho likvidácii na predpísanej skládke TKO, prípadne inej skládke, ktorá zodpovedá príslušným predpisom.
- h) Zhotoviteľ sa zaväzuje po celú dobu realizácie diela udržiavať v mieste výkonu diela čistotu a poriadok.
- i) Zhotoviteľ sa zaväzuje vybaviť si na vlastné náklady všetky súhlasy a povolenia potrebné pre realizáciu diela, vrátane vstupov na realizáciu diela dotknuté pozemky a s prácami na cestných komunikáciách, vrátane prenosného dopravného značenia, ak bude pre realizáciu diela potrebné.
- j) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri zhotovení diela použije len materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky v zmysle zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
- k) Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobí objednávateľovi porušením povinností pri realizovaní diela. Zhotoviteľ zodpovedá aj za škodu, ktorú pri vykonávaní diela pre objednávateľa podľa ustanovení zmluvy spôsobí svojim konaním tretím osobám.
- l) Zhotoviteľ sa zaväzuje nespevnené ako aj spevnené plochy, do ktorých zasiahne v rámci realizácie diela, uviesť do pôvodného stavu.
- m) Zhotoviteľ je povinný realizovať dielo len počas bezdažďového obdobia, kedy je prietok odpadových vôd najmenší, o konkrétnych termínoch realizácie prác na jednotlivých odľahčovacích komorách podľa čl. III ods. 2 zmluvy sa zhotoviteľ dohodne s technickým dozorom. V prípade rizika blížiacich sa zrážok alebo búrok je zhotoviteľ povinný zastaviť práce na realizácii diela.
- n) Spolu s dielom je zhotoviteľ povinný vypracovať a odovzdať objednávateľovi zápis o odovzdaní a prevzatí stavby, PD skutočného vyhotovenia, potvrdenia, rozhodnutia a iné doklady vydané počas realizácie diela, certifikáty a atesty od zabudovaných materiálov, všetko v 4 vyhotoveniach.
- o) Drobné zmeny a doplnky vyplývajúce z operatívnych potrieb pri zabezpečovaní realizácie diela, ktoré sú v súlade s vymedzením právomoci zástupcov oboch zmluvných strán oprávnených konať vo veciach technických, budú realizované formou zápisov do stavebného denníka.
- p) Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať právne predpisy na úseku ochrany pred nelegálnym zamestnávaním a nelegálnou prácou – najmä zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- q) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pokiaľ bude na účely realizácie diela zamestnávať štátneho príslušníka tretej krajiny, tak vo vzťahu k tejto osobe budú splnené podmienky ustanovené v §§ 21 a 23a ods. 1 a 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o

zmene a doplnení niektorých zákonov. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za dodržanie týchto podmienok aj u svojich subdodávateľov a je povinný priebežne kontrolovať dodržiavanie týchto predpisov vo vzťahu k nelegálnej práci a nelegálnemu zamestnávaniu aj u svojich subdodávateľov. V prípade porušenia uvádzaných povinností zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľom nesie zhotoviteľ zodpovednosť za akúkoľvek škodu (najmä za sankcie a iné obdobné plnenia), ktorú nesplnením povinností podľa tohto písmena tohto odseku tohto článku zmluvy objednávateľovi spôsobí.

- r) Zhotoviteľ je povinný najneskôr pri odovzdávanom a preberacom konaní staveniska odovzdať objednávateľovi zoznam zamestnancov (zhotoviteľa aj subdodávateľov), ktorí sa budú podieľať na realizácii diela. Zhotoviteľ je tiež povinný za seba a svojich subdodávateľov riadne preukázať, že u osôb, s ktorými majú založený pracovnoprávny vzťah na účely realizácie diela, boli splnené povinnosti zamestnávateľa na úseku prihlasovania zamestnancov do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia v lehotách podľa § 231 ods. 1 písm. b) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „registračná povinnosť“). V prípade nesplnenia tejto povinnosti voči objednávateľovi je objednávateľ oprávnený odmietnuť odovzdanie staveniska. Ak zhotoviteľ riadne nepreukáže tieto skutočnosti ani v dodatočnej lehote 5 pracovných dní odo dňa neodovzdania staveniska, objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť a postupovať podľa čl. IX zmluvy. V prípade vzniku registračnej povinnosti zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov v priebehu realizácie diela, je zhotoviteľ povinný preukázať jej splnenie najneskôr v deň, kedy sa dotknutý zamestnanec začne podieľať na realizácii diela.

2. Práva a povinnosti objednávateľa:

- a) Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi miesto realizácie diela v termíne do 5 dní od uzatvorenia zmluvy. K prevzatiu staveniska vyzve objednávateľ zhotoviteľa e-mailom na adresu osoby oprávnenej konať v mene zhotoviteľa vo veciach technických.
- b) Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru počas prác na diele Ing. Jakuba Slabého (slaby@tavos.sk), ktorý je oprávnený vykonávať zápisy do stavebného denníka, podpisovať, prerušiť práce – v prípade ohrozenia bezpečnosti práce, životov alebo zdravia pracovníkov alebo ak hrozia vážne škody a je oprávnený za objednávateľa preberať práce ako i dielo, ktorého realizácia je predmetom zmluvy.
- c) Kontrolou dodržiavania povinností zhotoviteľa podľa čl. V ods. 1 písm. p), q), r) zmluvy (za seba a svojich subdodávateľov) je poverený Bc. Roman Pokopec (pokopec@tavos.sk).
- d) Objednávateľ je oprávnený priebežne kontrolovať realizáciu diela. Ak pri kontrole zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami podľa zmluvy, nevykonáva dielo podľa platných noriem alebo smerníc, prípadne realizuje dielo v rozpore s predpismi BOZP alebo predpismi pre výstavbu a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území SR alebo v rozpore s pokynmi technického dozora, má právo žiadať, aby zhotoviteľ odstránil tieto nezrovnalosti vzniknuté pri zhotovovaní diela a ďalej dielo zhotovoval riadne v súlade s podmienkami stanovenými v zmluve. V prípade, že zhotoviteľ bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní odo dňa, keď mu objednávateľ oznámil svoju požiadavku, nevyhovie uvedeným požiadavkám objednávateľa, považuje sa jeho konanie za podstatné porušenie zmluvy (§ 345 Obchodného zákonníka) a objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť.
- e) K predĺženiu termínu realizácie diela môže, okrem neposkytnutia súčinnosti objednávateľom, dôjsť len na základe pôsobenia vyššej moci, pričom za okolnosti vylučujúce zodpovednosť (vyššiu moc) sa považuje najmä:
- vojna
 - epidémia
 - povodeň
 - štrajk

- e. kroky vládnej administratívy (radikálna zmena legislatívy, zákaz výstavby v danom území...)
- f) V prípade pôsobenia vyššej moci, ktorá má vplyv na predĺženie termínu realizácie diela, je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi vzniknutú prekážku a jej dôsledky na plnenie zmluvných povinností. Musí tak urobiť v primeranej lehote po tom, čo sa o vzniku prekážky dozvedel alebo mal dozvedieť, v opačnom prípade zodpovednosť zhotoviteľa za náhradu škody nezaniká a objednávateľ si môže voči zhotoviteľovi náhradu škody nárokovať.

Článok VI. Vlastnícke právo

1. Materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpečuje zhotoviteľ. Kúpna cena týchto vecí, ako aj cena za ich použitie je súčasťou dohodnutej ceny diela v čl. IV ods. 1 zmluvy. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom týchto vecí až do ich pevného zabudovania do objektov podľa čl. III ods. 2 zmluvy.

Článok VII. Záručné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ má povinnosť bezplatného odstránenia vady.
2. Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku 24 mesiacov na dodávané strojno-technologické zariadenia (pokiaľ ich výrobca neposkytuje dlhšiu záruku) a 60 mesiacov na stavebné práce. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí vykonaného diela podľa čl. III ods. 4 zmluvy.
3. Vykonané dielo má vady, ak nezodpovedá výsledku, ktorý je požadovaný zmluvou alebo neplní účel, pre ktorý bolo dielo zhotovené, prípadne svojím rozsahom nezodpovedá rozsahu stanovenému zmluvou.
4. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase odovzdania objednávateľovi ako aj za vady, ktoré sa prejavujú v záručnej dobe.
5. Prípadné vady diela, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe, musí objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa písomne (listom na adresu sídla zhotoviteľa alebo emailom), s opisom vady a prípadne aj fotodokumentáciou, najneskôr do 15 dní odo dňa zistenia väd. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne (listom na adresu sídla objednávateľa alebo e-mailom na e-mailovú adresu osoby oprávnenej konať v mene objednávateľa vo veciach technických: burdej@tavos.sk) zareagovať na reklamáciu objednávateľa bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 pracovných dní po tom, čo sa o vade diela dozvedel.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním väd diela bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľa a odstrániť ich v čo technicky najkratšom možnom čase, najneskôr však do 10 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa v súlade s ods. 5 tohto článku zmluvy. V prípade, že odstránenie reklamovanej vady nie je v uvedenom termíne z objektívnych dôvodov možné, vykoná sa odstránenie vady v termíne určenom písomnou dohodou (aj e-mailom) zmluvných strán.
7. V prípade, ak zhotoviteľ nezareaguje na reklamáciu objednávateľa v dohodnutej lehote alebo nezačne odstraňovať reklamovanú vadu bez zbytočného odkladu po jej uplatnení, prípadne neodstráni reklamovanú vadu najneskôr v lehote uvedenej v ods. 6 tohto článku zmluvy alebo v lehote určenej dohodou zmluvných strán, je objednávateľ oprávnený reklamovanú vadu odstrániť sám, resp. prostredníctvom iného zhotoviteľa a náklady na opravu a odstránenie vady sa zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť, resp. súhlasí s tým, aby úhrada bola realizovaná zo zadržanej sumy.

Článok VIII. Sankcie

1. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, je zhotoviteľ oprávnený fakturovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej sumy bez DPH za každý začatý deň omeškania.

2. Ak zhotoviteľ nedodrží termín realizácie diela podľa článku III. ods. 1 zmluvy (je v omeškaní) z iného dôvodu než pôsobenie vyššej moci, je povinný uhradiť objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z ceny celého diela spolu bez DPH za každý začatý deň omeškania.
3. Ak zhotoviteľ nezareaguje na reklamáciu objednávateľa alebo neodstráni reklamovanú vadu v lehotách podľa čl. VII ods. 5 alebo 6 zmluvy, je povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 110,-€ za každý začatý deň omeškania.
4. Ak zhotoviteľ bez zákonného alebo zmluvne dohodnutého dôvodu zanechá zhotovovanie diela, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 15% z ceny celého diela spolu bez DPH.
5. Zmluvné strany si pre prípad omeškania zhotoviteľa dohodli paušalizovanú náhradu interných administratívnych monitorovacích nákladov vo výške 500 Eur, ktorú je povinný uhradiť zhotoviteľ.
6. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody spôsobenej konaním alebo nekonaním zhotoviteľa.

Článok IX. Odstúpenie od zmluvy

1. Ak zhotoviteľ neplní niektorú zo zmluvných povinností, objednávateľ je oprávnený písomným oznámením (aj e-mailom) vyzvať zhotoviteľa, aby svoje povinnosti riadne plnil a zanedbania dal do poriadku v primeranej lehote, prípadne v lehote určenej zmluvou.
2. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť:
 - 2.1. v prípade, ak zhotoviteľ hoci aj z nedbanlivosti poruší zmluvu podstatným spôsobom, pričom za podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa sa považuje najmä:
 - 2.1.1. zhotoviteľ zanechá realizáciu diela a prejavuje úmysel v diele nepokračovať,
 - 2.1.2. ak zhotoviteľ bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní odo dňa, keď mu objednávateľ oznámil svoju požiadavku, nevyhoví požiadavkám objednávateľa na odstránenie nezrovnalostí vzniknutých pri zhotovovaní diela.
 - 2.1.3. ak u zhotoviteľa dôjde k úpadku, alebo platobnej neschopnosti, zhotoviteľ vstúpi do likvidácie, alebo bude vydané rozhodnutie o začatí konkurzu alebo reštrukturalizácie voči zhotoviteľovi, alebo ak voči nemu bude vedené exekučné konanie alebo ak nastane podobná skutočnosť, ktorá by mohla ovplyvniť ďalšie plnenie zmluvy;
 - 2.1.4. v prípade, ak zhotoviteľ porušil zmluvu nepodstatným spôsobom a nesplnil svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá mu bola poskytnutá a v prípadoch, ak to ustanovuje Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
3. Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť len:
 - 3.1. v prípade, ak objednávateľ hoci aj z nedbanlivosti poruší zmluvu podstatným spôsobom, pričom za podstatné porušenie zmluvy zo strany objednávateľa sa považuje:
 - 3.1.1. ak objednávateľ neuhradí faktúru ani do dvoch kalendárnych mesiacov po uplynutí lehoty splatnosti,
 - 3.1.2. ak objednávateľ napriek písomnej výzve neposkytne zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť nevyhnutnú k realizácii diela,
 - 3.1.3. ak objednávateľ bezdôvodne odmietne prevziať dielo;
 - 3.2. v prípade, ak objednávateľ porušil zmluvu nepodstatným spôsobom a nesplnil svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá mu bola poskytnutá a v prípadoch, ak to ustanovuje Obchodný zákonník v účinnom znení.
4. Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle zmluvy za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej strane bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 pracovných dní po tom, ako sa o porušení dozvedela. Pre určenie lehoty je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky odoslania oznámenia o odstúpení od zmluvy.
5. Potom čo oznámenie o odstúpení nadobudne platnosť, zhotoviteľ urýchlene :
 - 5.1. zastaví všetky ďalšie práce s výnimkou takých, ku ktorým dal technický dozor pokyn na dokončenie z dôvodu ochrany života, majetku, bezpečnosti na diele a pod.;

- 5.2. odovzdá všetku dokumentáciu zhotoviteľa;
 - 5.3. odstráni zo miest realizácie diela celé vybavenie a materiály, okrem tých, ktoré sú potrebné k zaisteniu bezpečnosti.
6. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán vyplývajúce zo zmluvy, okrem povinnosti zhotoviteľa pri zániku a odstúpení od zmluvy, nárokov objednávateľa uvedených v zmluve, na náhradu spôsobenej škody, na zmluvné pokuty, sankcie, resp. zákonné sankcie a úroky.
 7. Po zániku zmluvy odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi rozostavané dielo v stave, v akom sa ku dňu odstúpenia nachádza. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi spolu s rozostavaným dielom všetky prevzaté listiny a materiály od objednávateľa.
 8. O odovzdaní a prevzatí rozostavaného diela pri odstúpení od zmluvy spíšu poverení zástupcovia strán protokol, ktorý obsahuje rozsah odovzdávanej časti diela, súpis odovzdávaných dokladov a ocenenie vykonaných prác a dodávok, z toho sa uvedie osobitne zaplatená čiastka a čiastka zostávajúca k úhrade, dátumy a podpisy poverených zástupcov.

Článok X.

Záverečné ustanovenia

1. Vzájomné vzťahy zmluvných strán, pokiaľ nie sú upravené v zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území SR. Pre prípad sporov alebo nezrovnalostí ohľadom záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy sa stanovuje nasledovné poradie dôležitosti dokumentov:
 - i. Zmluva,
 - ii. Obchodný zákonník a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy,
 - iii. Cenová ponuka a ostatné súťažné podklady.
2. Zmluvu možno meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Návrhy dodatkov sú oprávnené podávať obidve zmluvné strany.
3. Zmenu obchodného mena, sídla, DIČ, právnej formy, adresy pre poštový styk, čísla účtu, telefónnych čísiel, e-mailovej adresy a mien kontaktných osôb (vrátane technického dozora) nie je potrebné vykonať dodatkom, postačuje jednostranné písomné oznámenie týchto skutočností doručené druhej zmluvnej strane, ktoré bude podpísané oprávnenými zástupcami konajúcej zmluvnej strany. Zmluvné strany sa zaväzujú, že každú zmenu údajov uvedených v predchádzajúcej vete oznámia druhej zmluvnej strane do 10 dní, odkedy ku zmene došlo.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že technické informácie, ktoré mu boli zverené objednávateľom, nesprístupní tretím osobám alebo tieto informácie nepoužije pre iné účely než pre plnenie podmienok zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať obchodné tajomstvo podľa § 17a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR.
5. Zmluvné strany sa zaväzujú, že prípadné spory vyplývajúce zo zmluvy budú riešiť dobromyseľne vzájomným rokovaním. Ak sa nedosiahne dohoda v sporných otázkach, spor bude predložený k rozhodnutiu príslušnému všeobecnému súdu podľa zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok.
6. Do plynutia lehôt počítaných na dni sa nezaratúva deň rozhodujúcej udalosti. Listiny zasielané medzi zmluvnými stranami prostredníctvom poštového podniku sa považujú za doručené aj v prípade, že sa zásielka vráti odosielateľovi s reláciou poštového podniku „Adresát neznámy“ alebo „Neprevzaté v odbernej lehote“, alebo ak ju adresát odmietol prevziať, a to dňom, keď sa zásielka vrátila odosielajúcej zmluvnej strane.
7. Zhotoviteľ berie na vedomie a akceptuje, že zmluva (vrátane jej príloh) podlieha režimu zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) ako povinne zverejňovaná zmluva a nemá námietky voči zverejneniu akéhokoľvek údajov obsiahnutého v zmluve.

8. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, účinnosť v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a je vyhotovená v 3 rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží 2 rovnopisy zmluvy a zhotoviteľ 1 rovnopis zmluvy.
9. Zmluvné strany potvrdzujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, nakoľko je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle zbavenej akýchkoľvek omylov, na znak čoho ju vlastnoručne podpísali.

Príloha č. 1. Cenová ponuka

V Piešťanoch, dňa 11.01.2021

V, dňa.....

za objednávateľa:

Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.

za zhotoviteľa:


FERRMONT a.s.

.....
Ing. Vla
predseda

.....
Ivan Šišť
podpredseda predstavenstva a.s.

.....
I
F

Príloha č. 1



NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ

Spoločnosť: **FERRMONT, a. s.**
sídlo: Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchov, Slovenská republika
zastúpenie: Ing. Radovan Lahoda, predseda predstavenstva
Ing. Juraj Rutzký, člen predstavenstva
Ing. Tomáš Focko, člen predstavenstva
Ing. Radovan Gáži, člen predstavenstva
Ing. Martin Lahoda, člen predstavenstva
IČO: 31 619 916

1. **Kritérium na vyhodnotenie ponúk:**
Celková cena vrátane DPH.

CELKOVÁ (ZMLUVNÁ) CENA

Kritérium na vyhodnotenie ponúk	Plnenie
Celková (zmluvná) cena bez DPH	60 897,43 €
20 % DPH	12 179,49 €
Celková (zmluvná) cena vrátane DPH	73 076,92 €

2. **Čestné prehlásenie uchádzača**

Spoločnosť FERRMONT, a. s., so sídlom: Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchov, Slovenská republika IČO: 31 619 916, ako uchádzač vo verejnej súťaži na predmet zákazky: „Zachytávanie plávajúcich nečistôt v odľahčovacích komorách kanalizácie v Trnave“, vyhlásenej verejným obstarávateľom: Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany, Slovenská republika, zverejnenej vo Výzve na predloženie cenovej ponuky – súťažné podklady zo dňa 15.10.2020,

čestne vyhlasuje,

- že riešenie uvedené v tejto cenovej ponuke zodpovedá svojimi parametrami špecifikácii a požiadavkám verejného obstarávateľa na predmet zákazky a požadovaným náležitostiam uvedeným v súťažných podkladoch,
- že cena predmetu zákazky za obstarávaný predmet je uvedená na základe vlastných prepočtov, berie do úvahy všetky skutočnosti, ktoré sú nevyhnutné na úplné a riadne plnenie zmluvy, pričom do ceny sú zahrnuté všetky náklady spojené s požadovaným predmetom zákazky.

V Bratislave, dňa 05. 11. 2020

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 401

Stavba: ZARIADENIA NA ZACHYTÁVANIE PLÁVAJÚCICH NEČISTÔT - OK na kan.sieti Trnava

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 5.11.2020

Objednávateľ:
TAVOS, a.s.

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
FERRMONT a.s. Púchov

IČO: 31619916
IČ DPH: SK2020441907

Projektant:
HYCOPROJEKT,a.s.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing.R. Krčmárik

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **60 897,43**

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
DPH znížená	20,00%	60 897,43	12 179,49

Cena s DPH **73 076,92**
v EUR

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

05. 11. 2020

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 401

Stavba: ZARIADENIA NA ZACHYTÁVANIE PLÁVAJÚCICH NEČISTÔT - OK na kan.sieti Trnava

Miesto:

Dátum:

05.11.2020

Objednávateľ: TAVOS, a.s.

Projektant:

HYCOPROJEKT, a.s.

Zhotoviteľ: FERRMONT a.s. Púchov

Spracovateľ:

Ing.R. Krčmárik

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		60 897,43	73 076,92
401.1	OK 1B	3 782,20	4 538,64
401.2	OK 2B	2 318,74	2 782,49
401.3	OK 3B	3 966,13	4 759,36
401.4	OK 4B	5 612,61	6 735,13
401.5	OK 5B	5 612,61	6 735,13
401.6	OK 6B	5 496,53	6 595,84
401.7	OK 7B	955,08	1 146,10
401.8	OK 8B	2 285,79	2 742,95
401.9	OK 9B	1 403,86	1 684,63
401.10	OK 10B	3 833,06	4 599,67
401.11	OK 1G	2 086,24	2 503,49
401.12	OK 1D	2 451,51	2 941,81
401.13	OK 1II	1 371,22	1 645,46
401.14	OK 1I	2 117,65	2 541,18
401.15	OK 3A	1 287,75	1 545,30
401.16	OK 2AN1	2 835,09	3 402,11
401.17	OK 1AN	4 015,77	4 818,92
401.18	OK 1A2	2 268,83	2 722,60
401.19	OK 1AM	2 069,32	2 483,18
401.20	OK 2AI	1 953,14	2 343,77
401.21	OK IK	2 019,65	2 423,58
401.22	OK ČOV	1 154,65	1 385,58

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZARIADENIA NA ZACHYTÁVANIE PLÁVAJÚCICH NEČISTÔT - OK na kan.sieti

Trnava

Objekt:

401.1 - OK 1B

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

TAVOS, a.s.

Zhotoviteľ:

FERRMONT a.s. Púchov

Projektant:

HYCOPROJEKT,a.s.

Spracovateľ:

Ing.R. Krčmárik

Poznámka:

KS:

Dátum:

05.11.2020

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

31619916

SK2020441907

Cena bez DPH				3 782,20
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	3 782,20	20,00%	756,44	
Cena s DPH		v EUR		4 538,64

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

05. 11.

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a po

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZARIADENIA NA ZACHYTÁVANIE PLÁVAJÚCICH NEČISTÔT - OK na kan.sieti

Trnava

Objekt:

401.1 - OK 1B

Miesto:

Dátum:

05.11.2020

Objednávateľ:

TAVOS, a.s.

Projektant:

HYCOPROJEKT, a.

Zhotoviteľ:

FERRMONT a.s. Púchov

Spracovateľ:

s.
Ing.R. Krčmárik

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

3 782,20

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

3 782,20

3 782,20

ROZPOČET

Stavba:

ZARIADENIA NA ZACHYTÁVANIE PLÁVAJÚCICH NEČISTÔT - OK na kan.sieti

Objekt:

Trnava

401.1 - OK 1B

Miesto:

Dátum: 05.11.2020

Objednávateľ:

TAVOS, a.s.

Projektant:

HYCOPROJEKT, a.
s.

Zhotoviteľ:

FERRMONT a.s. Púchov

Spracovateľ:

Ing.R. Krčmárik

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							3 782,20
D	PSV		Práce a dodávky PSV				3 782,20
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				3 782,20
1	K	7676622101a	D+M Kompozitného zariadenia na zachytávanie plávajúcich nečistôt v zmysle PD , vrátane nosných a pomocných profilov, nerezového kotviaceho materiálu	m	5,50	650,18	3 575,99
2	K	000500022.S	Príprava staveniska - montážne plošiny, zabezpečenie vstupu na miestnej komunikácii s dopravným značením	kpl	1,00	206,21	206,21

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZARIADENIA NA ZACHYTÁVANIE PLÁVAJÚCICH NEČISTÔT - OK na kan.sieti

Trnava

Objekt:

401.2 - OK 2B

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

05.11.2020

Objednávateľ:

TAVOS, a.s.

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

FERRMONT a.s. Púchov

IČO:

31619916

IČ DPH:

SK2020441907

Projektant:

HYCOPROJEKT,a.s.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing.R. Krčmárik

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 318,74

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	2 318,74	20,00%	463,75

Cena s DPH

v EUR

2 782,49

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka


Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

05. 11. 2020
Dátum a podpis:

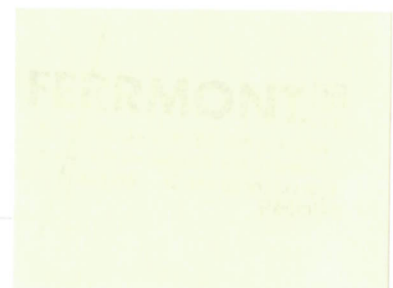

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZARIADENIA NA ZACHYTÁVANIE PLÁVAJÚCICH NEČISTÔT - OK na kan.sieti
Trnava

Objekt: **401.2 - OK 2B**

Miesto:

Dátum: 05.11.2020

Objednávateľ: TAVOS, a.s.

Projektant: HYCOPROJEKT,a.
s.

Zhotoviteľ: FERRMONT a.s. Púchov

Spracovateľ: Ing.R. Krčmárik

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

2 318,74

PSV - Práce a dodávky PSV

2 318,74

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

2 318,74

ROZPOČET

Stavba:

ZARIADENIA NA ZACHYTÁVANIE PLÁVAJÚCICH NEČISTÔT - OK na kan.sieti

Objekt:

Trnava

401.2 - OK 2B

Miesto:

Dátum: 05.11.2020

Objednávateľ: TAVOS, a.s.

Projektant: HYCOPROJEKT, a.s.

Zhotoviteľ: FERRMONT a.s. Púchov

Spracovateľ: Ing.R. Krčmárik

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 318,74

D PSV Práce a dodávky PSV 2 318,74

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 2 318,74

1	K	7676622101a	D+M Kompozitného zariadenia na zachytávanie plávajúcich nečistôt v zmysle PD , vrátane nosných a pomocných profilov, nerezového kotviaceho materiálu	m	3,50	603,58	2 112,53
2	K	000500022.S	Príprava staveniska - montážne plošiny, zabezpečenie vstupu na miestnej komunikácii s dopravným značením	kpl	1,00	206,21	206,21

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZARIADENIA NA ZACHYTÁVANIE PLÁVAJÚCICH NEČISTÔT - OK na kan.sieti

Trnava

Objekt:

401.3 - OK 3B

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

TAVOS, a.s.

Zhotoviteľ:

FERRMONT a.s. Púchov

Projektant:

HYCOPROJEKT, a.s.

Spracovateľ:

Ing.R. Krčmárik

Poznámka:

KS:

Dátum:

05.11.2020

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

31619916

SK2020441907

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

3 966,13

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	3 966,13	20,00%	793,23

Cena s DPH

v EUR

4 759,36

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

05.11.2020



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZARIADENIA NA ZACHYTÁVANIE PLÁVAJÚCICH NEČISTÔT - OK na kan.sieti

Trnava

Objekt:

401.3 - OK 3B

Miesto:

Dátum:

05.11.2020

Objednávateľ:

TAVOS, a.s.

Projektant:

HYCOPROJEKT, a.
s.

Zhotoviteľ:

FERRMONT a.s. Púchov

Spracovateľ:

Ing.R. Krčmárik

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

3 966,13

PSV - Práce a dodávky PSV

3 966,13

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

3 966,13

ROZPOČET

Stavba: ZARIADENIA NA ZACHYTÁVANIE PLÁVAJÚCICH NEČISTÔT - OK na kan.sieti

Objekt: Trnava
401.3 - OK 3B

Miesto:

Dátum: 05.11.2020

Objednávateľ: TAVOS, a.s.

Projektant: HYCOPROJEKT, a.s.

Zhotoviteľ: FERRMONT a.s. Púchov

Spracovateľ: Ing.R. Krčmárik

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 966,13

D PSV Práce a dodávky PSV 3 966,13

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 3 966,13

1	K	7676622101a	D+M Kompozitného zariadenia na zachytávanie plávajúcich nečistôt v zmysle PD , vrátane nosných a pomocných profilov, nerezového kotviaceho materiálu	m	5,10	737,24	3 759,92
2	K	000500022.S	Príprava staveniska - montážne plošiny, zabezpečenie vstupu na miestnej komunikácii s dopravným značením	kpl	1,00	206,21	206,21

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZARIADENIA NA ZACHYTÁVANIE PLÁVAJÚCICH NEČISTÔT - OK na kan.sieti

Trnava

Objekt:

401.4 - OK 4B

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

05.11.2020

Objednávateľ:

TAVOS, a.s.

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

FERRMONT a.s. Púchov

IČO:

31619916

IČ DPH:

SK2020441907

Projektant:

HYCOPROJEKT, a.s.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing.R. Krčmárik

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 612,61

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	5 612,61	20,00%	1 122,52

Cena s DPH

v EUR

6 735,13

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

05.11.2020

Dátum a podpis:



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZARIADENIA NA ZACHYTÁVANIE PLÁVAJÚCICH NEČISTÔT - OK na kan.sieti
Trnava

Objekt: **401.4 - OK 4B**

Miesto:

Dátum: 05.11.2020

Objednávateľ: TAVOS, a.s.

Projektant: HYCOPROJEKT, a.
s.

Zhotoviteľ: FERRMONT a.s. Púchov

Spracovateľ: Ing.R. Krčmárik

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

5 612,61

PSV - Práce a dodávky PSV

5 612,61

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

5 612,61

ROZPOČET

Stavba:

ZARIADENIA NA ZACHYTÁVANIE PLÁVAJÚCICH NEČISTÔT - OK na kan.sieti

Trnava

Objekt:

401.4 - OK 4B

Miesto:

Dátum: 05.11.2020

Objednávateľ: TAVOS, a.s.

Projektant: HYCOPROJEKT, a.s.

Zhotoviteľ: FERRMONT a.s. Púchov

Spracovateľ: Ing.R. Krčmárik

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 612,61

D PSV Práce a dodávky PSV 5 612,61

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 5 612,61

1	K	7676622101a	D+M Kompozitného zariadenia na zachytávanie plávajúcich nečistôt v zmysle PD , vrátane nosných a pomocných profilov, nerezového kotviaceho materiálu	m	8,00	675,80	5 406,40
2	K	000500022.S	Príprava staveniska - montážne plošiny, zabezpečenie vstupu na miestnej komunikácii s dopravným značením	kpl	1,00	206,21	206,21

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZARIADENIA NA ZACHYTÁVANIE PLÁVAJÚCICH NEČISTÔT - OK na kan.sieti

Trnava

Objekt:

401.5 - OK 5B

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

TAVOS, a.s.

Zhotoviteľ:

FERRMONT a.s. Púchov

Projektant:

HYCOPROJEKT, a.s.

Spracovateľ:

Ing.R. Krčmárik

Poznámka:

KS:

Dátum:

05.11.2020

IČO:

IČ DPH:

IČO:

31619916

IČ DPH:

SK2020441907

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

5 612,61

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	5 612,61	20,00%	1 122,52

Cena s DPH

v EUR

6 735,13

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

05.11.2020



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZARIADENIA NA ZACHYTÁVANIE PLÁVAJÚCICH NEČISTÔT - OK na kan.sieti

Trnava

Objekt:

401.5 - OK 5B

Miesto:

Dátum:

05.11.2020

Objednávateľ:

TAVOS, a.s.

Projektant:

HYCOPROJEKT, a.
s.

Zhotoviteľ:

FERRMONT a.s. Púchov

Spracovateľ:

Ing.R. Krčmárik

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

5 612,61

PSV - Práce a dodávky PSV

5 612,61

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

5 612,61

ROZPOČET

Stavba: ZARIADENIA NA ZACHYTÁVANIE PLÁVAJÚCICH NEČISTÔT - OK na kan.sieti
Trnava

Objekt: 401.5 - OK 5B

Miesto:

Dátum: 05.11.2020

Objednávateľ: TAVOS, a.s.

Projektant: HYCOPROJEKT,a.
s.

Zhotoviteľ: FERRMONT a.s. Púchov

Spracovateľ: Ing.R. Krčmárik

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 612,61

D PSV Práce a dodávky PSV 5 612,61

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 5 612,61

1	K	7676622101a	D+M Kompozitného zariadenia na zachytávanie plávajúcich nečistôt v zmysle PD , vrátane nosných a pomocných profilov, nerezového kotviaceho materiálu	m	8,00	675,80	5 406,40
2	K	000500022.S	Príprava staveniska - montážne plošiny, zabezpečenie vstupu na miestnej komunikácii s dopravným značením	kpl	1,00	206,21	206,21

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZARIADENIA NA ZACHYTÁVANIE PLÁVAJÚCICH NEČISTÔT - OK na kan.sieti

Objekt:
Trnava

401.6 - OK 6B

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

05.11.2020

Objednávateľ:

TAVOS, a.s.

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

FERRMONT a.s. Púchov

IČO:

IČ DPH:

31619916

SK2020441907

Projektant:

HYCOPROJEKT,a.s.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing.R. Krčmárik

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 496,53

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	5 496,53	20,00%	1 099,31

Cena s DPH

v EUR

6 595,84

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

05. 11. 2020
Dátum a podpis:



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZARIADENIA NA ZACHYTÁVANIE PLÁVAJÚCICH NEČISTÔT - OK na kan.sieti

Trnava

Objekt:

401.6 - OK 6B

Miesto:

Dátum:

05.11.2020

Objednávateľ:

TAVOS, a.s.

Projektant:

HYCOPROJEKT, a.
s.

Zhotoviteľ:

FERRMONT a.s. Púchov

Spracovateľ:

Ing.R. Krčmárik

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

5 496,53

PSV - Práce a dodávky PSV

5 496,53

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

5 496,53

ROZPOČET

Stavba:

ZARIADENIA NA ZACHYTÁVANIE PLÁVAJÚCICH NEČISTÔT - OK na kan.sieti

Trnava

Objekt:

401.6 - OK 6B

Miesto:

Dátum: 05.11.2020

Objednávateľ: TAVOS, a.s.

Projektant: HYCOPROJEKT,a.
s.

Zhotoviteľ: FERRMONT a.s. Púchov

Spracovateľ: Ing.R. Krčmárik

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							5 496,53
D	PSV		Práce a dodávky PSV				5 496,53
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				5 496,53
1	K	7676622101a	D+M Kompozitného zariadenia na zachytávanie plávajúcich nečistôt v zmysle PD , vrátane nosných a pomocných profilov, nerezového kotviaceho materiálu	m	8,00	661,29	5 290,32
2	K	000500022.S	Príprava staveniska - montážne plošiny, zabezpečenie vstupu na miestnej komunikácii s dopravným značením	kpl	1,00	206,21	206,21



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZARIADENIA NA ZACHYTÁVANIE PLÁVAJÚCICH NEČISTÔT - OK na kan.sieti

Trnava

Objekt:

401.7 - OK 7B

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

05.11.2020

Objednávateľ:

TAVOS, a.s.

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

FERRMONT a.s. Púchov

IČO:

31619916

IČ DPH:

SK2020441907

Projektant:

HYCOPROJEKT,a.s.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing.R. Krčmárik

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **955,08**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	955,08	20,00%	191,02

Cena s DPH **v EUR** **1 146,10**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

05.11.2020
Dátum a podpis:



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZARIADENIA NA ZACHYTÁVANIE PLÁVAJÚCICH NEČISTÔT - OK na kan.sieti

Objekt:
Trnava

401.7 - OK 7B

Miesto:

Dátum: 05.11.2020

Objednávateľ: TAVOS, a.s.

Projektant: HYCOPROJEKT, a.
s.

Zhotoviteľ: FERRMONT a.s. Púchov

Spracovateľ: Ing.R. Krčmárik

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	955,08
PSV - Práce a dodávky PSV	955,08
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	955,08

ROZPOČET

Stavba:

ZARIADENIA NA ZACHYTÁVANIE PLÁVAJÚCICH NEČISTÔT - OK na kan.sieti

Trnava

Objekt:

401.7 - OK 7B

Miesto:

Dátum: 05.11.2020

Objednávateľ: TAVOS, a.s.

Projektant: HYCOPROJEKT, a.s.

Zhotoviteľ: FERRMONT a.s. Púchov

Spracovateľ: Ing.R. Krčmárik

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

955,08

D PSV Práce a dodávky PSV 955,08

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 955,08

1	K	7676622101a	D+M Kompozitného zariadenia na zachytávanie plávajúcich nečistôt v zmysle PD , vrátane nosných a pomocných profilov, nerezového kotviaceho materiálu	m	1,70	440,51	748,87
2	K	000500022.S	Príprava staveniska - montážne plošiny, zabezpečenie vstupu na miestnej komunikácii s dopravným značením	kpl	1,00	206,21	206,21

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZARIADENIA NA ZACHYTÁVANIE PLÁVAJÚCICH NEČISTÔT - OK na kan.sieti

Trnava

Objekt:

401.8 - OK 8B

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

TAVOS, a.s.

Zhotoviteľ:

FERRMONT a.s. Púchov

Projektant:

HYCOPROJEKT, a.s.

Spracovateľ:

Ing.R. Krčmárik

Poznámka:

KS:

Dátum:

05.11.2020

IČO:

IČ DPH:

IČO:

31619916

IČ DPH:

SK2020441907

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH				2 285,79
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižovaná	2 285,79	20,00%	457,16	
Cena s DPH		v EUR		2 742,95

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ


Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

05.11.2020

Dátum a podpis:

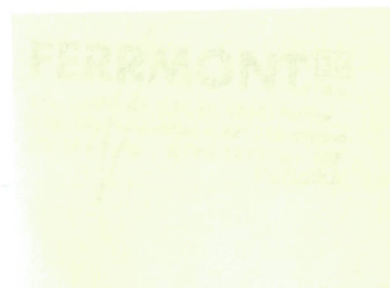

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZARIADENIA NA ZACHYTÁVANIE PLÁVAJÚCICH NEČISTÔT - OK na kan.sieti

Objekt:

Trnava

401.8 - OK 8B

Miesto:

Dátum:

05.11.2020

Objednávateľ:

TAVOS, a.s.

Projektant:

HYCOPROJEKT, a.
s.

Zhotoviteľ:

FERRMONT a.s. Púchov

Spracovateľ:

Ing.R. Krčmárik

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

2 285,79

PSV - Práce a dodávky PSV

2 285,79

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

2 285,79

ROZPOČET

Stavba:

ZARIADENIA NA ZACHYTÁVANIE PLÁVAJÚCICH NEČISTÔT - OK na kan.sieti

Objekt:

Trnava

401.8 - OK 8B

Miesto:

Dátum:

05.11.2020

Objednávateľ:

TAVOS, a.s.

Projektant:

HYCOPROJEKT, a.
s.

Zhotoviteľ:

FERRMONT a.s. Púchov

Spracovateľ:

Ing.R. Krčmárik

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 285,79

D PSV

Práce a dodávky PSV

2 285,79

D 767

Konštrukcie doplnkové kovové

2 285,79

1	K	7676622101a	D+M Kompozitného zariadenia na zachytávanie plávajúcich nečistôt v zmysle PD , vrátane nosných a pomocných profilov, nerezového kotviaceho materiálu	m	3,60	577,66	2 079,58
2	K	000500022.S	Príprava staveniska - montážne plošiny, zabezpečenie vstupu na miestnej komunikácii s dopravným značením	kpl	1,00	206,21	206,21

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZARIADENIA NA ZACHYTÁVANIE PLÁVAJÚCICH NEČISTÔT - OK na kan.sieti

Trnava

Objekt:

401.9 - OK 9B

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

05.11.2020

Objednávateľ:

TAVOS, a.s.

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

FERRMONT a.s. Púchov

IČO:

31619916

IČ DPH:

SK2020441907

Projektant:

HYCOPROJEKT,a.s.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing.R. Krčmárik

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 403,86

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	1 403,86	20,00%	280,77

Cena s DPH

v EUR

1 684,63

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ


Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

05.11.2020

Dátum a podpis:

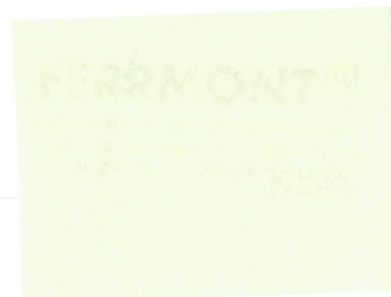

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZARIADENIA NA ZACHYTÁVANIE PLÁVAJÚCICH NEČISTÔT - OK na kan.sieti

Trnava

Objekt:

401.9 - OK 9B

Miesto:

Dátum:

05.11.2020

Objednávateľ:

TAVOS, a.s.

Projektant:

HYCOPROJEKT,a

Zhotoviteľ:

FERRMONT a.s. Púchov

Spracovateľ:

S.
Ing.R. Krčmárik

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 403,86

PSV - Práce a dodávky PSV

1 403,86

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

1 403,86

ROZPOČET

Stavba:

ZARIADENIA NA ZACHYTÁVANIE PLÁVAJÚCICH NEČISTÔT - OK na kan.sieti

Objekt:

Tmava

401.9 - OK 9B

Miesto:

Dátum: 05.11.2020

Objednávateľ:

TAVOS, a.s.

Projektant:

HYCOPROJEKT, a.
s.

Zhotoviteľ:

FERRMONT a.s. Púchov

Spracovateľ:

Ing.R. Krčmárik

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							1 403,86
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 403,86
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				1 403,86
1	K	7676622101a	D+M Kompozitného zariadenia na zachytávanie plávajúcich nečistôt v zmysle PD , vrátane nosných a pomocných profilov, nerezového kotviaceho materiálu	m	1,80	665,36	1 197,65
2	K	000500022.S	Príprava staveniska - montážne plošiny, zabezpečenie vstupu na miestnej komunikácii s dopravným značením	kpl	1,00	206,21	206,21

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZARIADENIA NA ZACHYTÁVANIE PLÁVAJÚCICH NEČISTÔT - OK na kan.sieti

Trnava

Objekt:

401.10 - OK 10B

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

TAVOS, a.s.

Zhotoviteľ:

FERRMONT a.s. Púchov

Projektant:

HYCOPROJEKT,a.s.

Spracovateľ:

Ing.R. Krčmárik

Poznámka:

KS:

Dátum:

05.11.2020

IČO:

IČ DPH:

IČO:

31619916

IČ DPH:

SK2020441907

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

3 833,06

DPH základná
znižovaná

Základ dane

0,00

3 833,06

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

766,61

Cena s DPH

v EUR

4 599,67

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

05.11.2020
Dátum a podpis:



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZARIADENIA NA ZACHYTÁVANIE PLÁVAJÚCICH NEČISTÔT - OK na kan.sieti

Trnava

Objekt:

401.10 - OK 10B

Miesto:

Dátum:

05.11.2020

Objednávateľ:

TAVOS, a.s.

Projektant:

HYCOPROJEKT, a.
s.

Zhotoviteľ:

FERRMONT a.s. Púchov

Spracovateľ:

Ing.R. Krčmárik

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

3 833,06

PSV - Práce a dodávky PSV

3 833,06

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

3 833,06

ROZPOČET

Stavba:

ZARIADENIA NA ZACHYTÁVANIE PLÁVAJÚCICH NEČISTÔT - OK na kan.sieti

Trnava

Objekt:

401.10 - OK 10B

Miesto:

Dátum: 05.11.2020

Objednávateľ: TAVOS, a.s.

Projektant: HYCOPROJEKT,a.
s.

Zhotoviteľ: FERRMONT a.s. Púchov

Spracovateľ: Ing.R. Krčmárik

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 833,06

D PSV Práce a dodávky PSV 3 833,06

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 3 833,06

1	K	7676622101a	D+M Kompozitného zariadenia na zachytávanie plávajúcich nečistôt v zmysle PD , vrátane nosných a pomocných profilov, nerezového kotviaceho materiálu	m	6,30	575,69	3 626,85
2	K	000500022.S	Príprava staveniska - montážne plošiny, zabezpečenie vstupu na miestnej komunikácii s dopravným značením	kpl	1,00	206,21	206,21

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZARIADENIA NA ZACHYTÁVANIE PLÁVAJÚCICH NEČISTÔT - OK na kan.sieti

Trnava

Objekt:

401.11 - OK 1G

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

TAVOS, a.s.

Zhotoviteľ:

FERRMONT a.s. Púchov

Projektant:

HYCOPROJEKT, a.s.

Spracovateľ:

Ing.R. Krčmárik

Poznámka:

KS:

Dátum:

05.11.2020

IČO:

IČ DPH:

IČO:

31619916

IČ DPH:

SK2020441907

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

2 086,24

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	2 086,24	20,00%	417,25

Cena s DPH

v EUR

2 503,49

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

05.11.2020

Dátum a podpis:



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZARIADENIA NA ZACHYTÁVANIE PLÁVAJÚCICH NEČISTÔT - OK na kan.sieti

Trnava

Objekt:

401.11 - OK 1G

Miesto:

Dátum:

05.11.2020

Objednávateľ:

TAVOS, a.s.

Projektant:

HYCOPROJEKT, a.
s.

Zhotoviteľ:

FERRMONT a.s. Púchov

Spracovateľ:

Ing.R. Krčmárik

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

2 086,24

PSV - Práce a dodávky PSV

2 086,24

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

2 086,24

ROZPOČET

Stavba:

ZARIADENIA NA ZACHYTÁVANIE PLÁVAJÚCICH NEČISTÔT - OK na kan.sieti

Objekt:
Trnava

401.11 - OK 1G

Miesto:

Dátum: 05.11.2020

Objednávateľ: TAVOS, a.s.

Projektant: HYCOPROJEKT, a.
s.

Zhotoviteľ: FERRMONT a.s. Púchov

Spracovateľ: Ing.R. Krčmárik

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 086,24

D PSV Práce a dodávky PSV 2 086,24

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 2 086,24

1	K	7676622101a	D+M Kompozitného zariadenia na zachytávanie plávajúcich nečistôt v zmysle PD , vrátane nosných a pomocných profilov, nerezového kotviaceho materiálu	m	3,20	587,51	1 880,03
2	K	000500022.S	Príprava staveniska - montážne plošiny, zabezpečenie vstupu na miestnej komunikácii s dopravným značením	kpl	1,00	206,21	206,21

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZARIADENIA NA ZACHYTÁVANIE PLÁVAJÚCICH NEČISTÔT - OK na kan.sieti

Trmava

Objekt:

401.12 - OK 1D

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

TAVOS, a.s.

Zhotoviteľ:

FERRMONT a.s. Púchov

Projektant:

HYCOPROJEKT,a.s.

Spracovateľ:

Ing.R. Krčmárik

Poznámka:

KS:

Dátum:

05.11.2020

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

31619916

SK2020441907

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

2 451,51

DPH základná
znižovaná

Základ dane

0,00

2 451,51

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

490,30

Cena s DPH

v EUR

2 941,81

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

05.11.2020
Dátum a podpis:



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZARIADENIA NA ZACHYTÁVANIE PLÁVAJÚCICH NEČISTÔT - OK na kan.sieti

Trnava

Objekt:

401.12 - OK 1D

Miesto:

Dátum:

05.11.2020

Objednávateľ:

TAVOS, a.s.

Projektant:

HYCOPROJEKT, a.
s.

Zhotoviteľ:

FERRMONT a.s. Púchov

Spracovateľ:

Ing.R. Krčmárik

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

2 451,51

PSV - Práce a dodávky PSV

2 451,51

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

2 451,51

ROZPOČET

Stavba:

ZARIADENIA NA ZACHYTÁVANIE PLÁVAJÚCICH NEČISTÔT - OK na kan.sieti

Trnava

Objekt:

401.12 - OK 1D

Miesto:

Dátum: 05.11.2020

Objednávateľ: TAVOS, a.s.

Projektant: HYCOPROJEKT, a.
s.

Zhotoviteľ: FERRMONT a.s. Púchov

Spracovateľ: Ing.R. Krčmárik

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 451,51

D PSV Práce a dodávky PSV 2 451,51

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 2 451,51

1	K	7676622101a	D+M Kompozitného zariadenia na zachytávanie plávajúcich nečistôt v zmysle PD , vrátane nosných a pomocných profilov, nerezového kotviaceho materiálu	m	3,10	724,29	2 245,30
2	K	000500022.S	Príprava staveniska - montážne plošiny, zabezpečenie vstupu na miestnej komunikácii s dopravným značením	kpl	1,00	206,21	206,21

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZARIADENIA NA ZACHYTÁVANIE PLÁVAJÚCICH NEČISTÔT - OK na kan.sieti

Trnava

Objekt:

401.13 - OK 1II

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

05.11.2020

Objednávateľ:

TAVOS, a.s.

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

FERRMONT a.s. Púchov

IČO:

31619916

IČ DPH:

SK2020441907

Projektant:

HYCOPROJEKT,a.s.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing.R. Krčmárik

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				1 371,22
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižovaná	1 371,22	20,00%	274,24	
Cena s DPH	v EUR			1 645,46

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

05.11.2020



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZARIADENIA NA ZACHYTÁVANIE PLÁVAJÚCICH NEČISTÔT - OK na kan.sieti
Trnava
Objekt: 401.13 - OK 1II

Miesto:

Dátum: 05.11.2020

Objednávateľ: TAVOS, a.s.

Projektant: HYCOPROJEKT,a.
s.

Zhotoviteľ: FERRMONT a.s. Púchov

Spracovateľ: Ing.R. Krčmárik

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 371,22

PSV - Práce a dodávky PSV

1 371,22

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

1 371,22

ROZPOČET

Stavba:

ZARIADENIA NA ZACHYTÁVANIE PLÁVAJÚCICH NEČISTÔT - OK na kan.sieti

Trnava

Objekt:

401.13 - OK 1II

Miesto:

Dátum: 05.11.2020

Objednávateľ:

TAVOS, a.s.

Projektant:

HYCOPROJEKT,a.
s.

Zhotoviteľ:

FERRMONT a.s. Púchov

Spracovateľ:

Ing.R. Krčmárik

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							1 371,22
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 371,22
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				1 371,22
1	K	7676622101a	D+M Kompozitného zariadenia na zachytávanie plávajúcich nečistôt v zmysle PD , vrátane nosných a pomocných profilov, nerezového kotviaceho materiálu	m	1,80	647,23	1 165,01
2	K	000500022.S	Príprava staveniska - montážne plošiny, zabezpečenie vstupu na miestnej komunikácii s dopravným značením	kpl	1,00	206,21	206,21

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZARIADENIA NA ZACHYTÁVANIE PLÁVAJÚCICH NEČISTÔT - OK na kan.sieti

Trnava

Objekt:

401.14 - OK 11

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

05.11.2020

Objednávateľ:

TAVOS, a.s.

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

FERRMONT a.s. Púchov

IČO:

IČ DPH:

31619916

SK2020441907

Projektant:

HYCOPROJEKT,a.s.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing.R. Krčmárik

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				2 117,65
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižovaná	2 117,65	20,00%	423,53	
Cena s DPH		v EUR		2 541,18

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

05.11.2020



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZARIADENIA NA ZACHYTÁVANIE PLÁVAJÚCICH NEČISTÔT - OK na kan.sieti

Objekt: Trnava
401.14 - OK 11

Miesto:

Objednávateľ: TAVOS, a.s.
Zhotoviteľ: FERRMONT a.s. Púchov

Dátum: 05.11.2020

Projektant: HYCOPROJEKT,a.
s.
Spracovateľ: Ing.R. Krčmárik

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	2 117,65
PSV - Práce a dodávky PSV	2 117,65
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	2 117,65

ROZPOČET

Stavba:

ZARIADENIA NA ZACHYTÁVANIE PLÁVAJÚCICH NEČISTÔT - OK na kan.sieti

Trnava

Objekt:

401.14 - OK 1I

Miesto:

Dátum: 05.11.2020

Objednávateľ: TAVOS, a.s.

Projektant: HYCOPROJEKT, a.s.

Zhotoviteľ: FERRMONT a.s. Púchov

Spracovateľ: Ing.R. Krčmárik

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 117,65

D PSV Práce a dodávky PSV

2 117,65

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové

2 117,65

1	K	7676622101a	D+M Kompozitného zariadenia na zachytávanie plávajúcich nečistôt v zmysle PD , vrátane nosných a pomocných profilov, nerezového kotviaceho materiálu	m	2,70	707,94	1 911,44
2	K	000500022.S	Príprava staveniska - montážne plošiny, zabezpečenie vstupu na miestnej komunikácii s dopravným značením	kpl	1,00	206,21	206,21

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZARIADENIA NA ZACHYTÁVANIE PLÁVAJÚCICH NEČISTÔT - OK na kan.sieti

Trnava

Objekt:

401.15 - OK 3A

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

05.11.2020

Objednávateľ:

TAVOS, a.s.

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

FERRMONT a.s. Púchov

IČO:

31619916

IČ DPH:

SK2020441907

Projektant:

HYCOPROJEKT, a.s.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing.R. Krčmárik

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				1 287,75
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	1 287,75	20,00%	257,55	
Cena s DPH	v EUR			1 545,30

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

05.11.2020

Dátum a podpis:



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZARIADENIA NA ZACHYTÁVANIE PLÁVAJÚCICH NEČISTÔT - OK na kan.sieti

Trnava

Objekt:

401.15 - OK 3A

Miesto:

Dátum:

05.11.2020

Objednávateľ:

TAVOS, a.s.

Projektant:

HYCOPROJEKT,a.
s.

Zhotoviteľ:

FERRMONT a.s. Púchov

Spracovateľ:

Ing.R. Krčmárik

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 287,75

PSV - Práce a dodávky PSV

1 287,75

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

1 287,75

ROZPOČET

Stavba:

ZARIADENIA NA ZACHYTÁVANIE PLÁVAJÚCICH NEČISTÔT - OK na kan.sieti

Trnava

Objekt:

401.15 - OK 3A

Miesto:

Dátum: 05.11.2020

Objednávateľ:

TAVOS, a.s.

Projektant:

HYCOPROJEKT, a.
s.

Zhotoviteľ:

FERRMONT a.s. Púchov

Spracovateľ:

Ing.R. Krčmárik

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							1 287,75
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 287,75
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				1 287,75
1	K	7676622101a	D+M Kompozitného zariadenia na zachytávanie plávajúcich nečistôt v zmysle PD , vrátane nosných a pomocných profilov, nerezového kotviaceho materiálu	m	2,20	491,61	1 081,54
2	K	000500022.S	Príprava staveniska - montážne plošiny, zabezpečenie vstupu na miestnej komunikácii s dopravným značením	kpl	1,00	206,21	206,21

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZARIADENIA NA ZACHYTÁVANIE PLÁVAJÚCICH NEČISTÔT - OK na kan.sieti

Trnava

Objekt:

401.16 - OK 2AN1

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

05.11.2020

Objednávateľ:

TAVOS, a.s.

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

FERRMONT a.s. Púchov

IČO:

IČ DPH:

31619916

SK2020441907

Projektant:

HYCOPROJEKT,a.s.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing.R. Krčmárik

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 835,09

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	2 835,09	20,00%	567,02

Cena s DPH

v EUR

3 402,11

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

05.11.2020
Dátum a podpis:



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZARIADENIA NA ZACHYTÁVANIE PLÁVAJÚCICH NEČISTÔT - OK na kan.sieti

Objekt:

Trnava

401.16 - OK 2AN1

Miesto:

Dátum:

05.11.2020

Objednávateľ:

TAVOS, a.s.

Projektant:

HYCOPROJEKT, a.
s.

Zhotoviteľ:

FERRMONT a.s. Púchov

Spracovateľ:

Ing.R. Krčmárik

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

2 835,09

PSV - Práce a dodávky PSV

2 835,09

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

2 835,09

ROZPOČET

Stavba:

ZARIADENIA NA ZACHYTÁVANIE PLÁVAJÚCICH NEČISTÔT - OK na kan.sieti

Objekt:

Trnava

401.16 - OK 2AN1

Miesto:

Dátum:

05.11.2020

Objednávateľ:

TAVOS, a.s.

Projektant:

HYCOPROJEKT, a.
s.

Zhotoviteľ:

FERRMONT a.s. Púchov

Spracovateľ:

Ing.R. Krčmárik

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							2 835,09
D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 835,09
D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				2 835,09
1	K	7676622101a	D+M Kompozitného zariadenia na zachytávanie plávajúcich nečistôt v zmysle PD , vrátane nosných a pomocných profilov, nerezového kotviaceho materiálu	m	4,00	657,22	2 628,88
2	K	000500022.S	Príprava staveniska - montážne plošiny, zabezpečenie vstupu na miestnej komunikácii s dopravným značením	kpl	1,00	206,21	206,21

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZARIADENIA NA ZACHYTÁVANIE PLÁVAJÚCICH NEČISTÔT - OK na kan.sieti

Trnava

Objekt:

401.17 - OK 1AN

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

05.11.2020

Objednávateľ:

TAVOS, a.s.

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

FERRMONT a.s. Púchov

IČO:

IČ DPH:

31619916

SK2020441907

Projektant:

HYCOPROJEKT,a.s.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing.R. Krčmárik

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 015,77

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	4 015,77	20,00%	803,15

Cena s DPH

v EUR

4 818,92

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

05.11.2020

Dátum a podpis:



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZARIADENIA NA ZACHYTÁVANIE PLÁVAJÚCICH NEČISTÔT - OK na kan.sieti

Trnava

Objekt:

401.17 - OK 1AN

Miesto:

Dátum:

05.11.2020

Objednávateľ:

TAVOS, a.s.

Projektant:

HYCOPROJEKT, a.
s.

Zhotoviteľ:

FERRMONT a.s. Púchov

Spracovateľ:

Ing.R. Krčmárik

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

4 015,77

PSV - Práce a dodávky PSV

4 015,77

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

4 015,77

ROZPOČET

Stavba:

ZARIADENIA NA ZACHYTÁVANIE PLÁVAJÚCICH NEČISTÔT - OK na kan.sieti

Trnava

Objekt:

401.17 - OK 1AN

Miesto:

Dátum: 05.11.2020

Objednávateľ:

TAVOS, a.s.

Projektant:

HYCOPROJEKT, a.
s.

Zhotoviteľ:

FERRMONT a.s. Púchov

Spracovateľ:

Ing.R. Krčmárík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 015,77

D PSV

Práce a dodávky PSV

4 015,77

D 767

Konštrukcie doplnkové kovové

4 015,77

1	K	7676622101a	D+M Kompozitného zariadenia na zachytávanie plávajúcich nečistôt v zmysle PD , vrátane nosných a pomocných profilov, nerezového kotviaceho materiálu	m	5,80	656,82	3 809,56
2	K	000500022.S	Príprava staveniska - montážne plošiny, zabezpečenie vstupu na miestnej komunikácii s dopravným značením	kpl	1,00	206,21	206,21

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZARIADENIA NA ZACHYTÁVANIE PLÁVAJÚCICH NEČISTÔT - OK na kan.sieti

Trnava

Objekt:

401.18 - OK 1A2

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

TAVOS, a.s.

Zhotoviteľ:

FERRMONT a.s. Púchov

Projektant:

HYCOPROJEKT,a.s.

Spracovateľ:

Ing.R. Krčmárik

Poznámka:

KS:

Dátum:

05.11.2020

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

31619916

SK2020441907

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

2 268,83

DPH základná
znižovaná

Základ dane

0,00

2 268,83

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

453,77

Cena s DPH

v EUR

2 722,60

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ


Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

05.11.2020

Dátum a podpis:

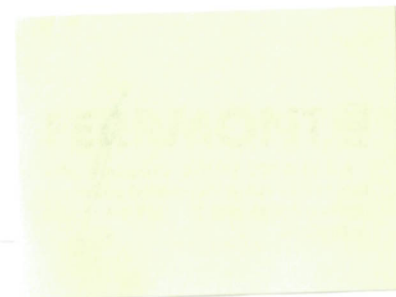

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZARIADENIA NA ZACHYTÁVANIE PLÁVAJÚCICH NEČISTÔT - OK na kan.sieti

Trnava

Objekt:

401.18 - OK 1A2

Miesto:

Dátum: 05.11.2020

Objednávateľ:

TAVOS, a.s.

Projektant:

HYCOPROJEKT,a.
s.

Zhotoviteľ:

FERRMONT a.s. Púchov

Spracovateľ:

Ing.R. Krčmárik

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

2 268,83

PSV - Práce a dodávky PSV

2 268,83

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

2 268,83

ROZPOČET

Stavba:

ZARIADENIA NA ZACHYTÁVANIE PLÁVAJÚCICH NEČISTÔT - OK na kan.sieti

Objekt:

Trnava

401.18 - OK 1A2

Miesto:

Dátum: 05.11.2020

Objednávateľ: TAVOS, a.s.

Projektant: HYCOPROJEKT, a.s.

Zhotoviteľ: FERRMONT a.s. Púchov

Spracovateľ: Ing.R. Krčmárik

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 268,83

D PSV Práce a dodávky PSV 2 268,83

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 2 268,83

1	K	7676622101a	D+M Kompozitného zariadenia na zachytávanie plávajúcich nečistôt v zmysle PD , vrátane nosných a pomocných profilov, nerezového kotviaceho materiálu	m	3,10	665,36	2 062,62
2	K	000500022.S	Príprava staveniska - montážne plošiny, zabezpečenie vstupu na miestnej komunikácii s dopravným značením	kpl	1,00	206,21	206,21

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZARIADENIA NA ZACHYTÁVANIE PLÁVAJÚCICH NEČISTÔT - OK na kan.sieti

Trnava

Objekt:

401.19 - OK 1AM

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

TAVOS, a.s.

Zhotoviteľ:

FERRMONT a.s. Púchov

Projektant:

HYCOPROJEKT,a.s.

Spracovateľ:

Ing.R. Krčmárik

Poznámka:

KS:

Dátum:

05.11.2020

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

31619916

SK2020441907

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH				2 069,32
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	2 069,32	20,00%	413,86	
Cena s DPH		v EUR		2 483,18

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

05.11.2020

Dátum a podpis:



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZARIADENIA NA ZACHYTÁVANIE PLÁVAJÚCICH NEČISTÔT - OK na kan.sieti

Trnava

Objekt:

401.19 - OK 1AM

Miesto:

Dátum:

05.11.2020

Objednávateľ:

TAVOS, a.s.

Projektant:

HYCOPROJEKT, a.
s.

Zhotoviteľ:

FERRMONT a.s. Púchov

Spracovateľ:

Ing.R. Krčmárik

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

2 069,32

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

2 069,32

2 069,32

ROZPOČET

Stavba:

ZARIADENIA NA ZACHYTÁVANIE PLÁVAJÚCICH NEČISTÔT - OK na kan.sieti

Trnava

Objekt:

401.19 - OK 1AM

Miesto:

Dátum: 05.11.2020

Objednávateľ: TAVOS, a.s.

Projektant: HYCOPROJEKT,a.
s.

Zhotoviteľ: FERRMONT a.s. Púchov

Spracovateľ: Ing.R. Krčmárik

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 069,32

D PSV Práce a dodávky PSV 2 069,32

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 2 069,32

1	K	7676622101a	D+M Kompozitného zariadenia na zachytávanie plávajúcich nečistôt v zmysle PD , vrátane nosných a pomocných profilov, nerezového kotviaceho materiálu	m	2,70	690,04	1 863,11
2	K	000500022.S	Príprava staveniska - montážne plošiny, zabezpečenie vstupu na miestnej komunikácii s dopravným značením	kpl	1,00	206,21	206,21

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZARIADENIA NA ZACHYTÁVANIE PLÁVAJÚCICH NEČISTÔT - OK na kan.sieti

Trnava

Objekt:

401.20 - OK 2AI

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

05.11.2020

Objednávateľ:

TAVOS, a.s.

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

FERRMONT a.s. Púchov

IČO:

IČ DPH:

31619916

SK2020441907

Projektant:

HYCOPROJEKT,a.s.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing.R. Krčmárik

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				1 953,14
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižovaná	1 953,14	20,00%	390,63	
Cena s DPH		v EUR		2 343,77

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka


Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

05.11.2020
Dátum a podpis:

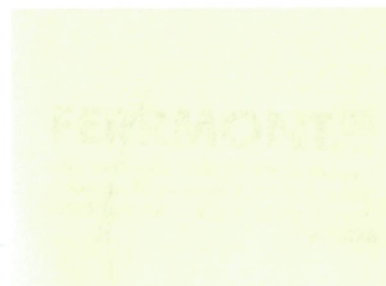

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZARIADENIA NA ZACHYTÁVANIE PLÁVAJÚCICH NEČISTÔT - OK na kan.sieti
Trnava

Objekt: **401.20 - OK 2AI**

Miesto:

Dátum: 05.11.2020

Objednávateľ: TAVOS, a.s.

Projektant: HYCOPROJEKT,a.
s.

Zhotoviteľ: FERRMONT a.s. Púchov

Spracovateľ: Ing.R. Krčmárik

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 953,14

PSV - Práce a dodávky PSV

1 953,14

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

1 953,14

ROZPOČET

Stavba:

ZARIADENIA NA ZACHYTÁVANIE PLÁVAJÚCICH NEČISTÔT - OK na kan.sieti

Trnava

Objekt:

401.20 - OK 2AI

Miesto:

Dátum:

05.11.2020

Objednávateľ:

TAVOS, a.s.

Projektant:

HYCOPROJEKT, a.
s.

Zhotoviteľ:

FERRMONT a.s. Púchov

Spracovateľ:

Ing.R. Krčmárik

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							1 953,14
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 953,14
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				1 953,14
1	K	7676622101a	D+M Kompozitného zariadenia na zachytávanie plávajúcich nečistôt v zmysle PD , vrátane nosných a pomocných profilov, nerezového kotviaceho materiálu	m	3,00	582,31	1 746,93
2	K	000500022.S	Príprava staveniska - montážne plošiny, zabezpečenie vstupu na miestnej komunikácii s dopravným značením	kpl	1,00	206,21	206,21

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZARIADENIA NA ZACHYTÁVANIE PLÁVAJÚCICH NEČISTÔT - OK na kan.sieti

Trnava

Objekt:

401.21 - OK IK

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

05.11.2020

Objednávateľ:

TAVOS, a.s.

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

FERRMONT a.s. Púchov

IČO:

IČ DPH:

31619916

SK2020441907

Projektant:

HYCOPROJEKT, a.s.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing.R. Krčmárik

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **2 019,65**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	2 019,65	20,00%	403,93

Cena s DPH **2 423,58**
v EUR

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

05.11.2020



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZARIADENIA NA ZACHYTÁVANIE PLÁVAJÚCICH NEČISTÔT - OK na kan.sieti
Trnava

Objekt: 401.21 - OK IK

Miesto:

Dátum: 05.11.2020

Objednávateľ: TAVOS, a.s.

Projektant: HYCOPROJEKT, a.
s.

Zhotoviteľ: FERRMONT a.s. Púchov

Spracovateľ: Ing.R. Krčmárik

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

2 019,65

PSV - Práce a dodávky PSV

2 019,65

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

2 019,65

ROZPOČET

Stavba: ZARIADENIA NA ZACHYTÁVANIE PLÁVAJÚCICH NEČISTÔT - OK na kan.sieti

Objekt: Trnava
401.21 - OK IK

Miesto:

Dátum: 05.11.2020

Objednávateľ: TAVOS, a.s.

Projektant: HYCOPROJEKT,a.
s.

Zhotoviteľ: FERRMONT a.s. Púchov

Spracovateľ: Ing.R. Krčmárik

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 019,65

D PSV

Práce a dodávky PSV

2 019,65

D 767

Konštrukcie doplnkové kovové

2 019,65

1	K	7676622101a	D+M Kompozitného zariadenia na zachytávanie plávajúcich nečistôt v zmysle PD , vrátane nosných a pomocných profilov, nerezového kotviaceho materiálu	m	3,10	584,98	1 813,44
2	K	000500022.S	Príprava staveniska - montážne plošiny, zabezpečenie vstupu na miestnej komunikácii s dopravným značením	kpl	1,00	206,21	206,21

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZARIADENIA NA ZACHYTÁVANIE PLÁVAJÚCICH NEČISTÔT - OK na kan.sieti

Trnava

Objekt:

401.22 - OK ČOV

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

TAVOS, a.s.

Zhotoviteľ:

FERRMONT a.s. Púchov

Projektant:

HYCOPROJEKT,a.s.

Spracovateľ:

Ing.R. Krčmárik

Poznámka:

KS:

Dátum:

05.11.2020

IČO:

IČ DPH:

IČO:

31619916

IČ DPH:

SK2020441907

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			1 154,65
DPH základná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
znižená	0,00	20,00%	0,00
	1 154,65	20,00%	230,93
Cena s DPH	v EUR		1 385,58

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

05.11.2020

Dátum a podpis:



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZARIADENIA NA ZACHYTÁVANIE PLÁVAJÚCICH NEČISTÔT - OK na kan.sieti

Trnava

Objekt:

401.22 - OK ČOV

Miesto:

Dátum:

05.11.2020

Objednávateľ:

TAVOS, a.s.

Projektant:

HYCOPROJEKT, a.
s.

Zhotoviteľ:

FERRMONT a.s. Púchov

Spracovateľ:

Ing.R. Krčmárik

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 154,65

PSV - Práce a dodávky PSV

1 154,65

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

1 154,65

ROZPOČET

Stavba:

ZARIADENIA NA ZACHYTÁVANIE PLÁVAJÚCICH NEČISTÔT - OK na kan.sieti

Trnava

Objekt:

401.22 - OK ČOV

Miesto:

Dátum: 05.11.2020

Objednávateľ: TAVOS, a.s.

Projektant: HYCOPROJEKT, a.s.

Zhotoviteľ: FERRMONT a.s. Púchov

Spracovateľ: Ing.R. Krčmárik

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							1 154,65
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 154,65
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				1 154,65
1	K	7676622101a	D+M Kompozitného zariadenia na zachytávanie plávajúcich nečistôt v zmysle PD , vrátane nosných a pomocných profilov, nerezového kotviaceho materiálu	m	1,80	526,91	948,44
2	K	000500022.S	Príprava staveniska - montážne plošiny, zabezpečenie vstupu na miestnej komunikácii s dopravným značením	kpl	1,00	206,21	206,21
